

ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ДОО БЕОГРАД
Бр. 555/1
26.01 16 год.
БЕОГРАД

ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
Немањина 22-26
БЕОГРАД

ПРОГРАМ РАДА
„ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ“ Д.О.О. БЕОГРАД
ЗА 2016. ГОДИНУ

Београд, јануар 2016.

САДРЖАЈ

| | |
|---|----|
| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ | 3 |
| ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА | 4 |
| УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА | 4 |
| ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ (УПРАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИМ ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА)..... | 6 |
| ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ..... | 10 |
| Термин план..... | 13 |
| ПРОЈЕКТНИ ТИМОВИ..... | 16 |
| УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА..... | 18 |
| ИЗВЕШТАВАЊЕ..... | 19 |

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

„ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд је основано Одлуком Владе Републике Србије о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“; број 51/10, 72/2013, 24/14 и 65/14), и уписан у регистар привредних друштава Агенције за привредне регистре, под бројем БД 87134/2010.

Пуно пословно име: Друштво с ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој“ Београд

Адреса: ул. Немањина бр. 22-26, Савски венац, Београд

Матични број: 20668890

Број регистрације: БД 87134/2010

ПИБ: 106729004

Датум оснивања: 09.08.2010. године

Оснивачи друштва: Влада Републике Србије 100%


Директор друштва: Др Горан Квргић

Шифра делатности: 7022

Назив делатности: Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

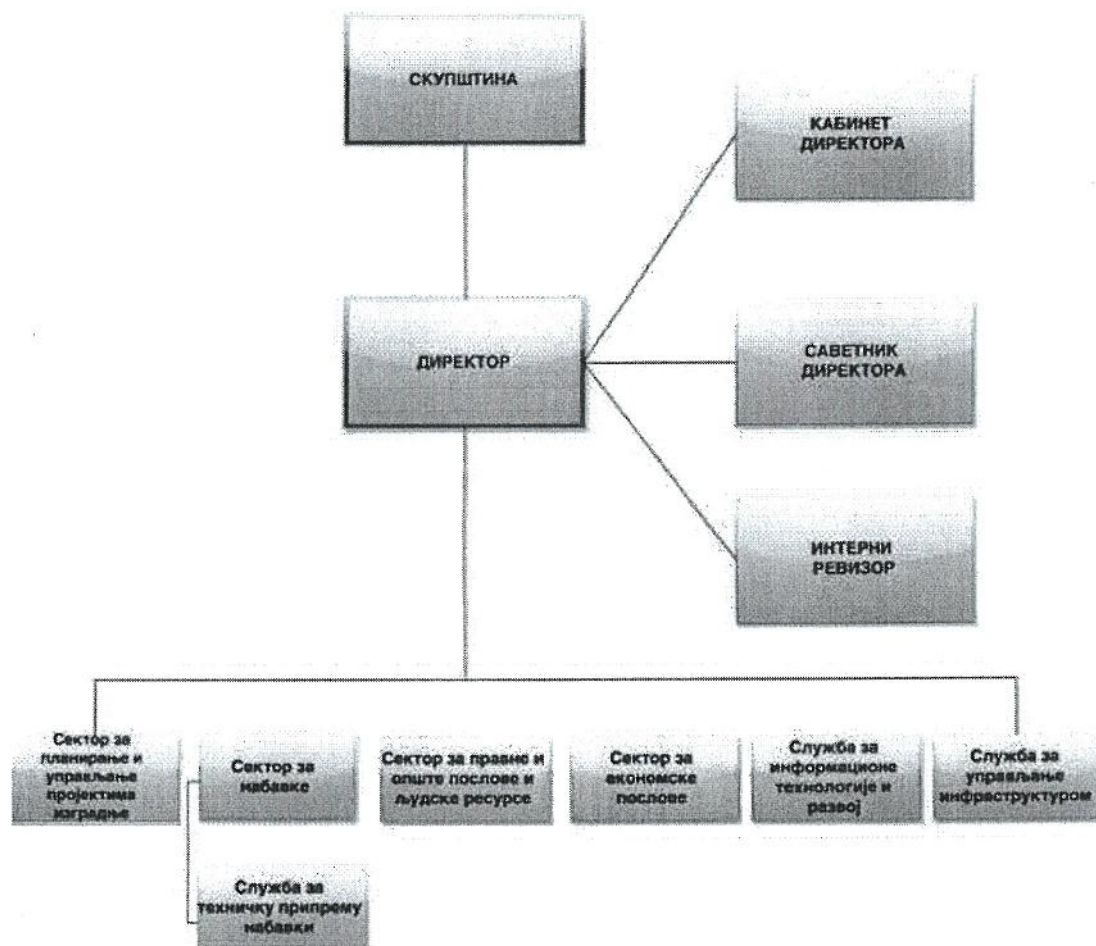

Организациона структура „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд утврђена је Правилником о организацији и систематизацији радних места у „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд број 1568 од 24.04.2015. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у „ЈУП Истраживање развој“ д.о.о. Београд број 5068 од 01.09.2015. године и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у „ЈУП Истраживање развој“ д.о.о. Београд број 6830 од 12.11.2015. године.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, Правилником су образовани основни организациони делови, и то:

1. Кабинет директора Друштва
2. Сектор за планирање и управљање пројектима изградње
3. Сектор за набавке
4. Сектор за правне и опште послове и људске ресурсе
5. Сектор за економске послове
6. Служба за информационе технологије и развој
7. Служба за управљање инфраструктуром

Ради обављања појединих врста сродних или истих међусобно повезаних послова, у оквиру Сектора за набавке, образује се унутрашња организациона јединица **Служба за техничку припрему набавки**.

Правилником о систематизацији радних места у ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд предвиђена су 2 самостална извршиоца и то:

- **Саветник директора за сарадњу са институцијама Владе и унапређење рада Друштва**
- **Интерни ревизор**

ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ (УПРАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИМ ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА)

План рада привредног друштва „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд првенствено се односи на управљање пројектима у оквиру три програма.

Први програм обухвата пројекте „**Ревитализације истраживања и развоја у јавном сектору у Србији**“, укључујући модернизацију постојећих истраживачких капацитета и инфраструктуре, формирање новог научног центра за унапређење научне писмености становништва, изградњу смештаја за студенте и младе научнике и модернизацију академске рачунарске мреже који се финансирају из средстава Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Развојне банке Савета Европе (ЦЕБ), Инструмента претприступне помоћи ЕУ (ИПА), Буџета Републике Србије и других извора.

Други програм обухвата пројекте „**Националног дела регионалног програма о трајним решењима за избегла лица**“ које се финансира из донаторског фонда којим управља Развојна банке Савета Европе (ЦЕБ). За овај пројекат је у плану да се у 2016. години спроводе пројекти првог, другог, трећег, четвртог и петог таласа.

Трећи програм у оквиру кога се налазе пројекти „**Програм модернизација школа**“ спроводи се по Финансијском уговору између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, којим је одобрен зајам у износу од ЕУР 50 милиона у циљу модернизације образовања у Србији, верификован је од стране Народне Скупштине Републике Србије и објављен у „Службеном гласнику - Међународни уговори“ број 8-10, дана 28. јула 2010. године и ступио на снагу 05. августа 2010. године. Уговор о изменама и допунама Финансијског уговора је потписан дана 27. марта 2015. године. Народна Скупштина РС ратификовала је Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора (програм модернизације школа) који је објављен у „Службеном гласнику“ МУ број 12-15 и ступио на снагу 30. јуна 2015. године, чиме су створени услови за наставак реализације пројекта.

Промотер пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС. Управљање оперативном реализацијом пројекта поверено је ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд.

Програми и пројекти којима управља „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд:

| | |
|---|---|
| 1 | ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ |
| 2 | НАЦИОНАЛНИ ДЕО РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА О ТРАЈНИМ РЕШЕЊИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА |
| 3 | ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА |

Следећи пројекти су реализовани, планирани да се реализују, да се заврше и да се покрену у 2016. години:

1. ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ

Пројекти који су завршени

- Природњачки центар Свилајнац
- Централна зграда Универзитета у Новом Саду
- Научно технолошки парк Звездара, Београд
- Научно технолошки парк, фаза 1, Нови Сад
- Истраживачка станица Петница, Ваљево
- Станови за младе истраживаче, Блок 32, Београд Фаза 1

Пројекти у току

- Наноцентар, Блок 39, Београд
- Центар за промоцију науке, Блок 39, Београд - фаза израде пројектне документације
- Набавка капиталне опреме за истраживање
- Систем за централизовану набавку потрошног материјала
- Станови за младе истраживаче, Крагујевац
- Центри изврности Универзитета у Крагујевцу
- Научно технолошки парк, фаза 2, Нови Сад
- Санација темеља - Хемијски факултет Универзитета у Београду

Пројекти у припреми и пројекти које треба покренути

- Адаптација простора UNESCO истраживачког центра IRTCUD, Београд
- Научно технолошки парк Ниш
- Станови за младе истраживаче, Ниш
- Центри изврности - Биомедицински истраживачки центар, Београд
- Опрема за Наноцентар, Блок 39, Београд
- Суперрачунарска иницијатива
- Центри изврности - Пољопривредно биотехнолошки центар, Нови Сад
- Центри изврности - Институт ветеринарских наука, Нови Сад
- Станови за младе истраживаче, Нови Сад
- Станови за младе истраживаче, Блок 32, Београд Фаза 2
- Зграда института, Блок 39, Београд
- Станови за младе истраживаче - Блок 32, Београд Фаза 3

Пројекти који су тренутно обустављени

- Кампус Математичке гимназије, Београд

- Адаптација и санација зграде у Светозара Марковића 21, Београд
- *Центар за матичне ћелије и доградња зграде Медицинског факултета у Крагујевцу
- *Научно технолошки парк Крагујевац
*(Центар за матичне ћелије и доградња зграде Медицинског факултета у Крагујевцу и Научно технолошки парк Крагујевац су обустављени и замењени са пројектом Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу)

2. НАЦИОНАЛНИ ДЕО РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА О ТРАЈНИМ РЕШЕЊИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

- Први талас пројеката
- Други талас пројеката
- Трећи талас пројеката
- Четврти талас пројеката
- Пети талас пројеката

| талас | компоненте | Вредност Гранта | Вредност Пројекта |
|----------|--|-----------------|-------------------|
| 1. талас | - 70 монтажних кућа - 125 пакета грађевинског материјала | 1.993.000 € | 2.212.500 € |
| 2. талас | - 200 стамбених јединица - 120 монтажних кућа - 300 пакета грађевинског материјала - 250 домаћинства са окућницом | 11.560.936 € | 12.933.600 € |
| 3. талас | - 235 стамбених јединица - 80 монтажних кућа - 350 пакета грађевинског материјала - 50 домаћинства са окућницом | 10.963.918 € | 13.642.918 € |
| 4. талас | - 261 стамбених јединица - 30 монтажних кућа - 300 пакета грађевинског материјала - 70 домаћинства са окућницом | 10.614.891 € | 11.979.974 € |
| 5. талас | - 992 + 270 стамбених јединица - 250 пакета грађевинског материјала - 200 домаћинства са окућницом | 36.348.906 € | 46.773.758 € |

3. ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА

Пројекат обухвата следеће три компоненте:

Компонента 1 садржи нову изградњу / проширење / завршетак 8 основних и 2 средње школе како би се елиминисало више од две смене у школама, као и набавку опреме како за ових десет школа, тако и за две основне школе у Београду чија је изградња финансирана од стране локалне управе.

У претходном периоду, у оквиру ове компоненте, завршена је изградња 6 основних и 2 средње школе, опремање ових 8 школа, као и 2 школе чија је градња финансирана другим средствима. Тренутно, у току је доградња ОШ „Војвода Степа“ у Београду, као и припреме тендерске документације за завршетак изградње објекта ОШ „Љупче Николић“ у Алексинцу.

Компонента 2 подржава стратешки развој образовног система у Србији и садржи три активности:

1. развој плана имплементације за Националну образовну стратегију, укључујући и учешће Србије у међународним тестирањима вредновања знања;
2. подршка за завршетак концепције и имплементацију Информационог и система управљања у образовању (делимично суфинансираног зајмом Светске банке); и
3. развој методологије за Стратешко планирање улагања за образовну инфраструктуру.

У оквиру ове компоненте реализоване су следеће активности:

Поткомпонента 1 - Стратегија развоја образовања у Србији

Документ „Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године“ је израђен, усвојен на седници Владе Републике Србије од 25. октобра 2012. године и објављен на веб сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и на веб сајту Владе Републике Србије.

Влада РС је Закључком 05 Број: 61-802/2015-1 од 23.01.2015. године усвојила и Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања.

- Евалуација образовних достигнућа

Учешће Републике Србије у међународно препознатим истраживањима и евалуацији образовних достигнућа (OECD/PISA 2012, OECD/TALIS 2, и TIMSS 2011), је спроведено у складу са иницијално планираним. Финансирање дела обавеза РС за учешће у наведеним истраживањима, које је предвиђено да се финансира средствима зајма ЕИБ у оквиру Програма модернизације школа, у целости је извршено током јула 2013. године.

На основу захтева МПНТР, Банка је 07.11.2014. год. дала сагласност и за финансирање накнаде за учешће РС у студији TIMSS 2015 из средстава зајма за “Програм модернизације школа” у укупно траженом износу од EUR 100.000 + USD 100.000. Уговор о учешћу у овој студији је закључен током априла 2015. год.

Поткомпонента 2 – Јединствени информациони систем у просвети

У оквиру ове поткомпоненте, предвиђено је финансирање набавке хардвера и софтвера за ЈИСП из средстава зајма за „Програм модернизације школа“. Ова активност још није реализована.

Поткомпонента 3 – Развој методологије за Стратешко планирање улагања у образовну инфраструктуру

Документ „EIB Support to Serbian Education in Developing Methodology for Strategic Investment Planning for Educational Infrastructure“ израђен је од стране консултанта EC Harris, ангажованог од стране зајмодавца.

Компонента 3 се тиче нове изградње и проширења или рехабилитације/модернизације школа широм Србије. Избор и давање приоритета школама које буду укључене у компоненту 3 биће резултат процеса рационализације развијеног у Компоненти 2, активност 3.

Школе које буду укључене у компоненте 1 и 3 имаће користи од комплетног оквира пакета, који обухвата: потпуно реновирање или нову изградњу школе, физкултурне сале, опремање школских кухиња, наставна средства, намештај, опрему, компјутерску опрему, итд. како би се школама омогућило да ваљано функционишу и спроводе модеран наставни план и програм.

Током 2015. год, закључени су уговори за извођење радова на изградњи, реконструкцији, санацији или адаптацији 51 школског објекта. Завршетак радова предвиђен је током првог дела 2016. године. Поступак набавке опреме за ове школе је у току, како би се испорука извршила одмах по завршетку радова и тиме омогућила пуна функционалност објеката.

До краја јануара предвиђено је објављивање позива за набавку радова за другу групу од 82 школска објекта, процењене вредности ЕУР 13,5 М, како би се највећи део радова извео до краја године. Током првог квартала 2016, предвиђено је и покретање набавке за преостале школске објекте обухваћене Компонентом 3 Програма.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Активности привредног друштва су планирање, реализација, праћење и контрола пројеката. Ове активности обухватају:

- формирање комисија, радних група и пројектних тимова који ће бити одговорни за управљање пројектима,
- дефинисање система контроле времена, квалитета и трошкова,
- прописивање система комуникације и извештавања на пројектима,
- анализу трошкова, анализу и утврђивање термин плана реализације,
- израду пројектних задатака,
- израду шеме управљања пројектом,
- прибављање локацијских услова,
- набавка капиталне опреме за истраживање
- набавка потрошног материјала

Поступак набавки добара, услуга и радова

- припрему и доношење одлуке о покретању поступка јавне набавке за избор добављача добара, пружаоца услуга пројектовања и избор извођача радова и формирање одговарајуће комисије за спровођење поступка и избор,

- припрему конкурсне документације, укључујући техничке и финансијске критеријуме за избор најповољнијег понуђача, у складу са Смерницама за набавке Европске инвестиционе банке, Упутством за набавке у оквиру Регионалног стамбеног програма, Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), Законом о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 14/2015) и другим прописима којима је регулисана предметна материја,
- припрему и објављивање јавних позива за подношење понуда за набавку добара, пружање услуга пројектовања и извођења радова,
- спровођење поступка уступања услуга и/или радова, закључно са предлогом за избор најповољнијег понуђача, према дефинисаним и усвојеним критеријумима,
- спровођење поступка набавке добара, закључно са предлогом за избор најповољнијег понуђача, према дефинисаним и усвојеним критеријумима,
- припремање и закључење уговора о испоруци добара, извођењу радова и обављању услуга, између ЈУП-а и најповољнијих понуђача,

управљање израдом пројектне документације,

- контролу и праћење процеса израде пројектне документације,
- именовање вршиоца техничке контроле пројектне документације,
- прибављање свих потребних сагласности, одобрења, дозвола и сл. у складу са важећим законима неопходних за увођење извођача у посао,

управљање изградњом објекта,

- обезбеђење предуслова за прибављање грађевинске дозволе,
- увођење извођача у посао,
- одобравање детаљног термин плана извођења радова, а по потреби иницирање израде и одобравање ребаланса плана, као и оперативних месечних планова,
- праћење изградње објекта и предузимање свих потребних мера за извршавање планова.
- контролу правовременог наручивања тј. набавки компоненти које имају дужи рок производње тј. испоруке,
- прибављање сертификата о осигурању радова и особља од извођача,
- уговарање и организовање стручног надзора над извођењем радова на градилиштима у току читавог периода изградње, сагласно Закону о планирању и изградњи, Правилнику о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника и Правилнику о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења,
- вршење стручног надзора над извођењем радова на градилиштима у току читавог периода изградње, сагласно Закону о планирању и изградњи, Правилнику о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника и Правилнику о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења,
- координацију рада са надлежним управама, инспекцијским службама, јавним предузећима и комуналним службама,
- издавање налога о техничким изменама и обезбеђивање сагласности на те измене,
- припремање процене радова: основних и додатних и њиховог утицаја на пројекат (финансије и рок) и рад на припреми елемената коначног обрачуна.

- формирање и учествовање у раду Комисије за технички преглед изведених радова на градилишту и сачињавању коначног обрачуна са извођачем радова,
- реализација свих финансијских трансакција у погледу плаћања извођачу радова, укључујући финалну исплату после коначног обрачуна, као и пријем гаранције којом се извођач обавезује на отклањање примедби у гарантном року,
- пријем сертификата противпожарне службе за изведене радове,
- издавање сертификата о примопредаји објеката,
- прибављање употребне дозволе,
- уколико је неопходно - израда Пројекта изведеног објекта,
- припрема потребне документације за упис објекта у земљишне књиге или катастар непокретности, као предуслова за појединачну укњижбу изграђених јединица објекта,
- ангажовање потребног броја извршилаца за праћење и обављање послова у периоду трајања гарантног рока од 2 године,
- организовање периодичних састанака са извођачима радова, извештавање о напредовању истих и мерама које се предузимају у циљу реализације пројекта у уговореним роковима,
- припреме извештаја за надлежне институције и Европску инвестициону банку у вези са спровођењем пројекта.

управљање набавком капиталне опреме за истраживање

- сортирање и груписање захтева за капиталном опремом,
- контролисање техничких описа у оквиру припрема за јавне набавке,
- припрема тендерске документације,
- учествовање у раду тендерских комисија за набавку добара и евалуација понуда,
- спровођење тендера за набавку капиталне опреме која су у току,
- ажурирање базе података,
- припрема извештаја за надлежне институције и Европску инвестициону банку и Банку за развој Савета Европе.

централизовани систем за набавку потрошног материјала

- пријем и евиденција захтева у складу са потребама научноистраживачких организација за потрошним материјалом путем Базе података потрошног материјала,
- спровођење тендера расписаних крајем 2015. године,
- контролисање динамике и квалитета испоруке добара до крајњих корисника након завршених тендера,
- управљање процесом исплате добављачима,
- припрема извештаја за надлежне институције и Европску инвестициону банку.

ТЕРМИН ПЛАН

ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ

| ID | FOUND | WBS | Task Name | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------|-----------|---|----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | | | Истраживање и развој | [Progress bar] | | | | | | | |
| 1 | EIB | PR017 | 1 Центар за промоцију науке - Блок 39, Београд | [Progress bar] | | | | | | | |
| 17 | EIB | PR001 | 2 Природњачки центар Свилајнац | [Progress bar] | | | | | | | |
| 18 | EIB | PR001.1 | 2.1 Изградња | [Progress bar] | | | | | | | |
| 19 | EIB | PR001.1.1 | 2.1.1 Главни пројекат | [Progress bar] | | | | | | | |
| 20 | EIB | PR001.1.2 | 2.1.2 Завршетак израде Главног пројекта | [Progress bar] | | | | | | | |
| 21 | EIB | PR001.1.3 | 2.1.3 Јавна набавка за извођење радова | [Progress bar] | | | | | | | |
| 22 | EIB | PR001.1.4 | 2.1.4 Потписивање уговора са извођачем | [Progress bar] | | | | | | | |
| 23 | EIB | PR001.1.5 | 2.1.5 Отварање градилишта | [Progress bar] | | | | | | | |
| 24 | EIB | PR001.1.6 | 2.1.6 Извођење радова | [Progress bar] | | | | | | | |
| 25 | EIB | PR001.1.7 | 2.1.7 Надзор над извођењем радова | [Progress bar] | | | | | | | |
| 26 | EIB | PR001.1.8 | 2.1.8 Отварање објекта и завршен технички преглед објекта | [Progress bar] | | | | | | | |
| 27 | EIB | PR001.2 | 2.2 Опрема за Природњачки центар Свилајнац | [Progress bar] | | | | | | | |
| 28 | EIB | PR001.2.1 | 2.2.1 Набавка опреме | [Progress bar] | | | | | | | |
| 29 | EIB СЕБ2 | PR002 | 3 Наноцентар, Блок 39, Београд | [Progress bar] | | | | | | | |
| 42 | EIB СЕБ1 | PR016 | 4 Набавка капиталне опреме за истраживање | [Progress bar] | | | | | | | |
| 43 | EIB СЕБ1 | PR016.1 | 4.1 Припрема документације за тендере, расписивање и спровођење | [Progress bar] | | | | | | | |
| 44 | EIB | PR016.2 | 4.2 Испорука опреме ЕИБ | [Progress bar] | | | | | | | |
| 45 | СЕБ1 | PR016.3 | 4.3 Испорука опреме ЦЕБ1 | [Progress bar] | | | | | | | |
| 46 | EIB | PR023 | 5 Систем за централизовану набавку потрошног материјала | [Progress bar] | | | | | | | |
| 47 | EIB | PR023.1 | 5.1 Пројекат - Систем за централизовану набавку потрошног материјала | [Progress bar] | | | | | | | |
| 48 | EIB | PR023.1.1 | 5.1.1 2011 Систем за централизовану набавку потрошног матер | [Progress bar] | | | | | | | |
| 49 | EIB | PR023.1.2 | 5.1.2 2012 Систем за централизовану набавку потрошног матер | [Progress bar] | | | | | | | |
| 50 | EIB | PR023.1.3 | 5.1.3 2013 Систем за централизовану набавку потрошног матер | [Progress bar] | | | | | | | |
| 51 | EIB | PR023.1.4 | 5.1.4 2014 Систем за централизовану набавку потрошног матер | [Progress bar] | | | | | | | |
| 52 | EIB | PR023.1.5 | 5.1.5 2015 Систем за централизовану набавку потрошног матер | [Progress bar] | | | | | | | |
| 53 | EIB | PR003 | 6 Централна зграда Универзитета у Новом Саду | [Progress bar] | | | | | | | |
| 54 | EIB | PR003.1 | 6.1 Изградња | [Progress bar] | | | | | | | |
| 55 | EIB | PR003.1.1 | 6.1.1 Завршетак израде Главног пројекта | [Progress bar] | | | | | | | |
| 56 | EIB | PR003.1.2 | 6.1.2 Јавна набавка за извођење радова | [Progress bar] | | | | | | | |
| 57 | EIB | PR003.1.3 | 6.1.3 Потписивање уговора са извођачем | [Progress bar] | | | | | | | |
| 58 | EIB | PR003.1.4 | 6.1.4 Отварање градилишта | [Progress bar] | | | | | | | |
| 59 | EIB | PR003.1.5 | 6.1.5 Извођење радова | [Progress bar] | | | | | | | |
| 60 | EIB | PR003.1.6 | 6.1.6 Надзор над извођењем радова | [Progress bar] | | | | | | | |
| 61 | EIB | PR003.1.7 | 6.1.7 Технички преглед објекта | [Progress bar] | | | | | | | |
| 62 | EIB | PR004 | 7 Научно технолошки парк Звездара, Београд | [Progress bar] | | | | | | | |
| 63 | EIB | PR004.1 | 7.1 Изградња | [Progress bar] | | | | | | | |
| 64 | EIB | PR004.1.1 | 7.1.1 Завршетак израде Главног пројекта | [Progress bar] | | | | | | | |
| 65 | EIB | PR004.1.2 | 7.1.2 Техничка контрола Главног пројекта | [Progress bar] | | | | | | | |
| 66 | EIB | PR004.1.3 | 7.1.3 Вештачење о легализацији | [Progress bar] | | | | | | | |
| 67 | EIB | PR004.1.4 | 7.1.4 Јавна набавка за извођење радова | [Progress bar] | | | | | | | |
| 68 | EIB | PR004.1.5 | 7.1.5 Потписивање уговора са извођачем | [Progress bar] | | | | | | | |
| 69 | EIB | PR004.1.6 | 7.1.6 Отварање градилишта | [Progress bar] | | | | | | | |
| 70 | EIB | PR004.1.7 | 7.1.7 Извођење радова | [Progress bar] | | | | | | | |
| 71 | EIB | PR004.1.8 | 7.1.8 Надзор над извођењем радова | [Progress bar] | | | | | | | |
| 72 | EIB | PR004.1.9 | 7.1.9 Технички преглед објекта | [Progress bar] | | | | | | | |
| 73 | EIB | PR006 | 8 Научно технолошки парк, фаза I, Нови Сад | [Progress bar] | | | | | | | |
| 74 | EIB | PR006.1 | 8.1 Изградња | [Progress bar] | | | | | | | |
| 75 | EIB | PR006.1.1 | 8.1.1 Завршетак израде Главног пројекта | [Progress bar] | | | | | | | |
| 76 | EIB | PR006.1.2 | 8.1.2 Јавна набавка за извођење радова | [Progress bar] | | | | | | | |
| 77 | EIB | PR006.1.3 | 8.1.3 Потписивање уговора са извођачем | [Progress bar] | | | | | | | |
| 78 | EIB | PR006.1.4 | 8.1.4 Отварање градилишта | [Progress bar] | | | | | | | |
| 79 | EIB | PR006.1.5 | 8.1.5 Извођење радова | [Progress bar] | | | | | | | |
| 80 | EIB | PR006.1.6 | 8.1.6 Надзор над извођењем радова | [Progress bar] | | | | | | | |
| 81 | EIB | PR006.1.7 | 8.1.7 Технички преглед објекта | [Progress bar] | | | | | | | |

| ID | FOUND | WBS | Task Name | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|------------|---|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 82 | EIB | PR008 | 9 Истраживачка станица Петница, Ваљево | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 83 | EIB | PR008.1 | 9.1 Изградња | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 84 | EIB | PR008.1.1 | 9.1.1 Завршетак израде Главног пројекта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 85 | EIB | PR008.1.2 | 9.1.2 Јавна набавка за извођење радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 86 | EIB | PR008.1.3 | 9.1.3 Потписивање уговора са извођачем | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 87 | EIB | PR008.1.4 | 9.1.4 Отварање градилишта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 88 | EIB | PR008.1.5 | 9.1.5 Извођење радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 89 | EIB | PR008.1.6 | 9.1.6 Надзор над извођењем радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 90 | EIB | PR008.1.7 | 9.1.7 Технички преглед објекта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 91 | EIB | PR008.2 | 9.2 Опрема за Истраживачку станицу Петница | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 92 | EIB | PR008.2.1 | 9.2.1 Набавка опреме | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 93 | CEB1 | PR010 | 10 Станови за младе истраживаче - Блок 32, Београд Фаза 1 | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 94 | CEB1 | PR010.1 | 10.1 Изградња | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 95 | CEB1 | PR010.1.1 | 10.1.1 Завршетак израде Главног пројекта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 96 | CEB1 | PR010.1.2 | 10.1.2 Јавна набавка за извођење радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 97 | CFR1 | PR010.1.3 | 10.1.3 Потписивање уговора са извођачем | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 98 | CEB1 | PR010.1.4 | 10.1.4 Отварање градилишта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 99 | CEB1 | PR010.1.5 | 10.1.5 Извођење радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 100 | CEB1 | PR010.1.6 | 10.1.6 Надзор над извођењем радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 101 | CEB1 | PR010.1.7 | 10.1.7 Технички преглед објекта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 102 | EIB | PR022 | 11 Савација темеља- Хемијски факултет Универзитета у Београду | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 103 | EIB | PR022.1 | 11.1 Завршетак израде Главног пројекта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 104 | CD | PR022.2 | 11.2 Јавна набавка за извођење радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 105 | EIB | PR022.3 | 11.3 Потписивање уговора са извођачем | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 106 | EIB | PR022.4 | 11.4 Отварање градилишта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 107 | EIB | PR022.5 | 11.5 Извођење радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 108 | EIB | PR022.6 | 11.6 Надзор над извођењем радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 109 | EIB | PR022.7 | 11.7 Технички преглед објекта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 110 | CEB2 | PR009 | 12 Станови за младе истраживаче - Крагујевац | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 111 | CEB2 | PR009.1 | 12.1 Изградња | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 112 | CEB2 | PR009.1.1 | 12.1.1 Јавна набавка за пројектовање-изградња | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 113 | CEB2 | PR009.1.6 | 12.1.2 Потписивање уговора са извођачем | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 114 | CFR2 | PR009.1.2 | 12.1.3 Почетак израде Главног пројекта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 115 | CEB2 | PR009.1.3 | 12.1.4 Израда Главног пројекта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 116 | CEB2 | PR009.1.4 | 12.1.5 Техничка контрола Главног пројекта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 117 | CEB2 | PR009.1.7 | 12.1.6 Отварање градилишта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 118 | CEB2 | PR009.1.8 | 12.1.7 Извођење радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 119 | CEB2 | PR009.1.9 | 12.1.8 Надзор над извођењем радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 120 | CEB2 | PR009.1.10 | 12.1.9 Технички преглед објекта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 121 | CD | PR030 | 13 Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 122 | EIB | PR030.1 | 13.1 Изградња | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 123 | EIB | PR030.1.1 | 13.1.1 Јавна набавка за израду Главног пројекта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 124 | | PR030.1.2 | 13.1.2 Потписивање уговора са пројектантом | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 125 | | PR030.1.3 | 13.1.3 Израда Главног пројекта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 126 | | PR030.1.4 | 13.1.4 Јавна набавка за извођење радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 127 | EIB | PR030.1.6 | 13.1.5 Потписивање уговора са извођачем | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 128 | EIB | PR030.1.7 | 13.1.6 Отварање градилишта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 129 | EIB | PR030.1.8 | 13.1.7 Извођење радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 130 | EIB | PR030.1.9 | 13.1.8 Надзор над извођењем радова | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 131 | EIB | PR030.1.10 | 13.1.9 Технички преглед објекта | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 132 | EIB | PR027 | 14 Опрема за Нансцентар, Блок 39, Београд | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 134 | CEB2 | PR013 | 15 Научно технолошки парк Ниш | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 144 | CEB2 | PR014 | 16 Станови за младе истраживаче - Ниш | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 150 | EIB | PR018 | 17 Суперрачунарска иницијатива | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 152 | CEB2 | PR019 | 18 Центри изврсности – Биомедицински истраживачки центар | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 164 | CEB2 | PR020 | 19 Центри изврсности - Пољопривредно биотехнолошки центар, Но | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 176 | CEB2 | PR021 | 20 Станови за младе истраживаче - Нови Сад | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 188 | CEB2 | PR026 | 21 Станови за младе истраживаче - Блок 32, Београд Фаза 2 | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 200 | CFR2 | PR026 | 22 Зграда института, Блок 39, Београд | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 212 | CEB2 | A1 | 23 Финансијска и техничка подршка ЈУП | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 214 | CEB2 | PR028 | 24 Центри изврсности - Институт за ветеринарске науке | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |
| 226 | EIB | PR012 | 25 Адаптација простора УНЕСЦО истраживачког центра ИРТЦУД, Бе | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | | |

| ID | FOUND | WBS | Task Name | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|---|---------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 237 | EIB | PR007 | 26 Научно технолошки парк, фаза II, Нови Сад | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | |
| 238 | EIB | PR007.1 | 26.1 Изградња | [Gantt bar from 10 to 17] | | | | | | |
| 239 | EIB | PR007.1.1 | 26.1.1 Главни пројекат | [Gantt bar from 10 to 11] | | | | | | |
| 240 | EIB | PR007.1.2 | 26.1.2 Завршетак израде Главног пројекта | [Gantt bar from 11 to 14] | | | | | | |
| 241 | EIB | PR007.1.3 | 26.1.3 Јавна набавка за извођење радова | [Gantt bar from 14 to 15] | | | | | | |
| 242 | EIB | PR007.1.4 | 26.1.4 Потписивање уговора са извођачем | [Gantt bar from 15 to 16] | | | | | | |
| 243 | EIB | PR007.1.5 | 26.1.5 Отварање градилишта | [Gantt bar from 16 to 17] | | | | | | |
| 244 | EIB | PR007.1.6 | 26.1.6 Извођење радова | [Gantt bar from 16 to 17] | | | | | | |
| 245 | EIB | PR007.1.7 | 26.1.7 Надзор над извођењем радова | [Gantt bar from 16 to 17] | | | | | | |
| 246 | EIB | PR007.1.8 | 26.1.8 Технички преглед објекта | [Gantt bar from 16 to 17] | | | | | | |
| 247 | EIB | PR024 | 27 Станови за младе истраживаче - Блок 32, Београд Фаза 3 | [Gantt bar from 10 to 11] | | | | | | |
| 249 | EIB | PR029 | 28 Кампус математичке гимназије | [Gantt bar from 10 to 11] | | | | | | |
| 251 | EIB | PR011 | 29 Адаптација и санација зграде у Светозара Марковића 21, Београд | [Gantt bar from 10 to 14] | | | | | | |
| 260 | EIB | PR005 | 30 Научно технолошки парк Крагујевац | [Gantt bar from 10 to 14] | | | | | | |
| 271 | EIB | PR015 | 31 Центар за матичне ћелије и доградња зграде Мед. факултета УК | [Gantt bar from 10 to 14] | | | | | | |

ТЕРМИН ПЛАН

НАЦИОНАЛНИ ДЕО РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА О ТРАЈНИМ РЕШЕЊИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

| ID | Task Name | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|---|------|------|------|
| 1 | Регионални стамбени програм Србија | █ | █ | █ |
| 2 | | | | |
| 3 | SRB 1 | | | |
| 4 | SRB 1.1 - ИЗГРАДЊА 66 МОНТАЖНИХ КУЋА | █ | | |
| 14 | SRB 1.2.2 - ИСПОРУКА 104 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА | █ | | |
| 17 | | | | |
| 18 | SRB 2 | | | |
| 19 | SRB 2.1 - ИЗГРАДЊА 200 СТАНОВА | █ | █ | |
| 31 | SRB 2.2 - ИЗГРАДЊА 120 МОНТАЖНИХ КУЋА | █ | █ | |
| 39 | SRB 2.3 - ИСПОРУКА 300 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА | █ | █ | |
| 47 | SRB 2.4 - КУПОВИНА 250 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА | █ | █ | |
| 53 | | | | |
| 54 | SRB 3 | | | |
| 55 | SRB 3.1 - ИЗГРАДЊА 235 СТАНОВА | █ | █ | |
| 63 | SRB 3.2 - ИЗГРАДЊА 80 МОНТАЖНИХ КУЋА | █ | █ | |
| 76 | SRB 3.3 - ИСПОРУКА 350 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА | █ | █ | |
| 89 | SRB 3.4 - КУПОВИНА 50 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА | █ | █ | |
| 101 | | | | |
| 102 | SRB 4 | | | |
| 103 | SRB 4.1 - ИЗГРАДЊА 261 СТАНА | █ | █ | |
| 115 | SRB 4.2 - ИЗГРАДЊА 30 МОНТАЖНИХ КУЋА | █ | █ | |
| 123 | SRB 4.3 - ИСПОРУКА 300 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА | █ | █ | |
| 136 | SRB 4.4 - КУПОВИНА 70 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА | █ | █ | |
| 142 | | | | |
| 143 | SRB 5 | | | |
| 144 | SRB 5.1 - ИЗГРАДЊА 992 СТАНА | █ | █ | |
| 161 | SRB 5.1.1 - ИЗГРАДЊА 270 СТАНОВА | █ | █ | |
| 178 | SRB 5.2 - ИЗГРАДЊА 250 МОНТАЖНИХ КУЋА | █ | █ | |
| 193 | SRB 5.3 - КУПОВИНА 200 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА | █ | █ | |

*ДЕТАЉАН ТЕРМИН ПЛАН је саставни део четворомесечних извештаја о пројекту РХП

ТЕРМИН ПЛАН
ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА

| ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| ГОДИНА : 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| БР | Активности | 2016 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| КОМПОНЕНТА 3 | | | | | | | | | | | | | |
| I ПРИПРЕМНА ФАЗА | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Анализа техничке документације | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Анализа захтева за опрему | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| II НАБАВКЕ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Радови - група 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Услуге стручног надзора - група 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Радови - група 2 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 4 | Услуге стручног надзора - група 2 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Радови - група 3 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 6 | Услуге стручног надзора - група 3 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Школски намештај и опрема - група 1 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 8 | Школски намештај и опрема - група 2 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 9 | Школски намештај и опрема - група 3 | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 10 | Опционо - радови/опрема у зависности од износа пресоталих средстава | | | | | | | | | | | | |
| III ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА | | | | | | | | | | | | | |
| III-1 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГРУПА 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 2 | ГРУПА 2 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | ГРУПА 3 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 | Опционо - радови/опрема у зависности од износа пресоталих средстава | | | | | | | | | | | | |
| III-2 СТРУЧНИ НАДЗОР | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГРУПА 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 2 | ГРУПА 2 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | ГРУПА 3 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 | Опционо - радови/опрема у зависности од износа пресоталих средстава | | | | | | | | | | | | |
| III-3 НАМЕШТАЈ И ИСПОРУКА ОПРЕМЕ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГРУПА 1 | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| 2 | ГРУПА 2 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | ГРУПА 3 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 4 | Опционо - радови/опрема у зависности од износа пресоталих средстава | | | | | | | | | | | | |
| КОМПОНЕНТА 1 И 2 - ПРЕОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | C1 ОШ Војвода Степа, Београд - извођење радова | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 2 | ОШ Војвода Степа, Београд - испорука опреме | | | | | ■ | | | | | | | |
| 3 | C1 ОШ Љупче Николић, Алексинац - извођење радова | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 4 | ОШ Љупче Николић, Алексинац - испорука опреме | | | | | | | | | ■ | | | |
| 5 | C2 ТИММСС 2015 студија | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 6 | C2 EIS | | | | | | | | | | | | |

КОМИСИЈЕ, РАДНЕ ГРУПЕ, ПРОЈЕКТНИ ТИМОВИ

За сваки пројекат биће формиране комисије, радне групе или пројектни тимови од запослених у „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд и од спољних чланова из организација које учествују у реализацији пројеката. Чланови комисија, радних група и тимова су:

- Председник комисије / Руководилац радне групе / Руководилац тима;
- Чланови комисије / Чланови радне групе / Чланови пројектног тима;
- Директори сектора и координатори;
- Руководиоци пројекта спровођење грант шема и координатори пројекта (РСП);
- Руководиоци служби;
- Представници извођача;
- Стручни надзор;
- Представници локалне самоуправе;
- Представници осталих значајних, заинтересованих страна на пројекту.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је скуп поступака и метода за утврђивање, мерење односно процењивање, савладавање и праћење ризика, укључујући и извештавање о ризицима којима је „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) изложен или би могао бити изложен у свом пословању.

Утврђивање и процена ризика представља део система управљања ризицима којима Друштво идентификује ризике којима је изложено или би могло бити изложено, процењује интензитет утицаја ризика као и њихов потенцијални утицај на континуитет пословања Друштва и остварење постављених пословних циљева.

Ризик је било који догађај или проблем, чије би наступање могло неповољно утицати на остварење пословних, стратешких, оперативних и финансијских циљева Друштва. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком.

За утврђивање и процену утицаја ризика којима је Друштво изложено или би могло бити изложено примењује се:

1. Процена финансијског и пословног положаја Друштва, а која обухвата:
 - а) процену билансног стања Друштва,
 - б) процену будућих оперативних и других прихода и трошкова Друштва,
2. Анализа спољног окружења Друштва,
3. Анализа пословних процеса и критичних тачака у пословним процесима,
4. Анализа претходних информација и искустава,
5. Редовни колегијуми менаџмента Друштва,
6. Извештаји интерног ревизора,
7. Извештаји функције праћења усклађености с релевантним прописима,
8. Остале интерне евиденције и извештаји.

Матрица ризика:

| | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|------------|
| Вероватноћа | Висока (3) | 3 | 6 | 9 |
| | Средња (2) | 2 | 4 | 6 |
| | Ниска (1) | 1 | 2 | 3 |
| | | Мали (1) | Средњи (2) | Велики (3) |
| | | Утицај | | |

Процена ризика у пословању Друштва врши се према матрици за мерење ризика 3x3, која има две врсте улазних информација – процене утицаја ризика и процене вероватноће појаве ризика. Укупна изложеност ризику добија се множењем бодова за утицај са бодовима за вероватноћу.

ИЗВЕШТАВАЊЕ

Током периода реализације пројеката „Истраживање и развој у јавном сектору“ у 2016. години ЈУП ће организовати периодичне информативне састанке у циљу информисања представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја о напретку у реализацији или евентуалним одступањима од плана и другим питањима која утичу на реализацију пројеката.

Привредно друштво ће подносити редовне извештаје Министарству просвете, науке и технолошког развоја о планирању и реализацији припремних радова и радова на градилишту.

Иницијални извештаји ће садржати кратак опис пројекта, детаљни план активности, начин реализације, начин вршења надзора и надгледања, претпоставке и ризике као и елементе одрживости.

Следећи извештаји треба да прецизирају стварни напредак активности током периода реализације пројеката у односу на планирани.

Коначни извештај за сваки пројекат привредно друштво ће поднети Министарству просвете, науке и технолошког развоја након извршеног техничког прегледа и примопредаје објекта и садржаће опис припреме и спроведених радова као и појединости техничке, финансијске и административне природе.

У оквиру пројекта „Националног дела регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“ извештавање ће се вршити у складу са упутством за имплементацију пројеката у оквиру Регионалног стамбеног програма на свака четири месеца кроз информациони систем који је израђен за ово извештавање (ММИС).

Извештавање у оквиру пројеката „Програм модернизације школа у Србији“ у 2016. години договорено је са Министарством просвете, науке и технолошког развоја према уговору између Министарства и ЈУП-а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА



Др Јордан Алексић
