

**ПРОЈЕКАТ
ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ
СЕКТОРУ**

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
септембар 2010.године - новембар 2016. године

Београд, новембар 2016. године

Пројекат Истраживање и развој у јавном сектору

Пројекат који има за циљ оживљавање истраживања и развоја у оквиру јавног сектора у Србији односи се на низ инвестиција у истраживање и развој јавног сектора, укључујући модернизацију постојећих истраживачких објеката и инфраструктуре, успостављање нових научних центара, изградњу станова за студенте и младе научнике и модернизацију академске рачунарске мреже.

Промотер пројекта и ентитет који је у потпуности одговоран за његову имплементацију, јесте Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Имплементација прве компоненте почела је у августу 2010. године.

Пројекат је финансиран из кредита Европске инвестиционе банке (ЕИБ) и Развојне банке Савета Европе (ЦЕБ), Инструмента за претприступну помоћ Европске уније и средстава Републике Србије. Кредити се реализују на основу следећег правног оквира:

- Закон о ратификацији финансијских уговора (Истраживање и развој у оквиру јавног сектора) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (ЕИБ)
- Закон о ратификацији Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије (Ф/П 1711 (2010.)) (ЦЕБ 1)
- Закон о ратификацији Оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије (Ф/П 1739 (2011.)) (ЦЕБ 2)

Истраживање и развој у јавном сектору у Србији је програм који се састоји од 29 потпројеката који су категорисани у складу са ЕИБ и ЦЕБ споразумима.

Програм истраживања и развоја - Структура финансирања

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	У милионима евра
I КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ	200.00
II Средства обезбеђена из кредита Развојне банке САВЕТА ЕВРОПЕ - у односу на ЕИБ третира се као средства од стране РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	
ЦЕБ 1711	35.00
ЦЕБ 1739	70.00
УКУПНО ЦЕБ	105.00
III Средства обезбеђена из буџета или од институција у Републици Србији, локалних самоуправа или из других извора у Републици Србији	ТБЦ (90.2)
IV ХЕТИП пројекат (претприступни фондови ЕУ)	30.7 (25.6)
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ	420.80

Потпројекти су категоризовани у уговорима на следећи начин:

Листа категорија потпројекта по финансијским уговорима

КАТЕГОРИЈА ПОТПРОЈЕКТА - ЕИБ
- Адаптација постојећих зграда и лабораторија
- Истраживачки центар Петница и кампус Математичке гимназије
- Нова капитална опрема за истраживања
- Програм за људске ресурсе у циљу привлачења скоро 1400 српских научника који раде у иностранству
- Центар за промоцију науке у Београду
- Оснивање Центара изврсности у областима истраживања где је приоритет: енергетика и енергетска ефикасност, заштита животне средине и климатске промене, наука о материјалима и нанонауке, пољопривреда и прехрана, биомедицина и информационо-комуникационе технологије.
- Модернизација академске рачунарске мреже и инфраструктуре за Суперкомпјутер иницијативу
- Нове стамбене зграде за младе истраживаче у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу
- Изградња Научно-технолошких паркова у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу
- Инфраструктура за Министарство просвете, науке и технолошког развоја
КАТЕГОРИЈА ПОТПРОЈЕКТА - ЦЕБ 1
- Компонента 1 (истраживачка опрема): куповина истраживачке опреме за јавне истраживачке јединице и лабораторије
- Компонента 2 (изнајмљивање смештаја младим истраживачима): изградња некомерцијалних смештајних објеката за изнајмљивање младим истраживачима са циљем унапређења њихових животних услова
КАТЕГОРИЈА ПОТПРОЈЕКАТ - ЦЕБ 2
- Компонента 1: оснивање Центара изврсности за области истраживања са приоритетом. - Изградња Центра за биомедицинска истраживања у Београду - Изградња и опремање Агробилошког и технолошког центра у Новом Саду - Изградња Центра за нове материјале и нанонауку у Београду
- Компонента 2: Изградња Научно-технолошког парка у Нишу
- Компонента 3: Изградња станова за изнајмљивање младим истраживачима у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
- Компонента 4: Финансијска и техничка подршка за ЈУП.

Према тренутним активностима на пројекту, списак потпројеката који су у процесу реализације, потпројеката који су у фази планирања и припрема, и потројеката који тек треба да се покрену, а који су још у почетној фази, дата је у наставку. Преглед потпројеката чија је реализација за сада суспендована такође је дата.

Завршени потпројекти

Научно-технолошки парк, фаза 1, Нови Сад;
Главна зграда Универзитета у Новом Саду;
Станови за младе научне раднике, Блок 32, Београд, фаза 1
Научно-технолошки парк Звездара, Београд;
Санација темеља - Хемијски факултет Универзитета у Београду; (радови завршени)
Природњачки центар Свилајнац
Истраживачка станица Петница, Ваљево

Потпројекти у току

Наноцентар, блок 39, Београд (главни пројекат завршен)
Центар за промоцију науке, Блок 39, Београд (фаза израде пројектне документације је завршена);
Набавка нове капиталне опреме за истраживање;
Централизовани систем за набавку потрошног материјала;
Станови за младе истраживаче Универзитета у Крагујевцу (радови на градилиштусу у завршној фази);
Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу (радови на градилишту су у току)
Научно-технолошки парк, фаза 2, Нови Сад (тендер за извођење радова је спроведен и потписан уговор са Извођачем радова, почетак радова);
Финансијска подршка за ЈУП; (закључен је уговор између МПНТР и ЈУП)

Потпројекти у припреми

Центри изврсности – Агробилошки и технолошки центар, Нови Сад;
Адаптација УНЕСКО ИРТЦУД истраживачког центра , Београд;
Станови за младе истраживаче, Ниш;
Опрема за Наноцентар, блок 39, Београд;
Научно-технолошки парк, Ниш;
Центар изврсности - Центар за биомедицинска истраживања, Београд;
Станови за младе научне раднике, Блок 32, Београд, фазе 2
Станови за младе научне раднике, Блок 32, Београд, фазе и 3;

Потпројекти који ће бити започети

Суперкомпјутер иницијатива;
Центри изврсности – Ветеринарски институт, Нови Сад
Станови за младе истраживаче, Нови Сад;
Објект института, блок 39, Београд;

Потпројекти тренутно суспендовани

Адаптација зграде у ул. Светозара Марковића 21, Београд;
Кампус Математичке гимназије, Београд;

Потпројекти који су отказани

Научно-технолошки парк у Крагујевцу;
Центар за матичне ћелије, придружена јединица Медицинског факултета у Крагујевцу.

*Потпројекти Научно технолошки парк у Крагујевцу и Центар за матичне ћелије, придружена јединица Медицинског факултета у Крагујевцу су отказани. Уместо њих спроводи се потпројекат изградње Центара изврсности Универзитета у Крагујевцу.

Потпројекти се спровode на локацијама у Републици Србији. Грађевински потпројекти се спровode у Београду, Крагујевцу, Нишу, Новом Саду, Ваљеву и Свилајнцу. Потпројекат за набавку капиталне опреме и потрошног материјала се спроводи на целој територији Републике Србије.

Листа потпројеката према локацијама

Наноцентар, блок 39, Београд	Београд
Научно-технолошки парк Звездара, Београд	Београд
Станови за младе научне раднике, блок 32, Београд, фаза 1	Београд
Центар за промоцију науке, блок 39, Београд	Београд
Поправка темеља - Хемијски факултет, Универзитет у Београду	Београд
Суперкомпјутер иницијатива	Београд
Станови за младе научне раднике, блок 32, Београд, фаза 2 и 3	Београд
Објект института, блок 39, Београд	Београд
Адаптација истраживачког центра УНЕСКО ИРТЦУД, Београд	Београд
Центри изврсности - Биомедицински истраживачки центар, Београд	Београд
Опрема за Наноцентар, блок 39, Београд	Београд
Адаптација зграде у Светозара Марковића 21, Београд	Београд
Финансијска подршка за ЈУП	Београд
Кампус Математичке гимназије	Београд

Станови за младе истраживаче, Крагујевац	Крагујевац
Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу	Крагујевац
Научно-технолошки парк у Нишу	Ниш
Станови за младе истраживаче, Ниш	Ниш
Главна зграда Универзитета у Новом Саду	Нови Сад
Научно-технолошки парк, фаза 1, Нови Сад	Нови Сад
Научно-технолошки парк, фаза 2, Нови Сад	Нови Сад
Центри изврсности - Агробилошки и технолошки центар, Нови Сад	Нови Сад
Центри изврсности - Институт за ветеринарске науке, Нови Сад	Нови Сад
Станови за младе истраживаче, Нови Сад	Нови Сад
Природњачки центар Свилајнац	Свилајнац
Истраживачка станица Петница, Ваљево	Ваљево
Нова капитална опрема за истраживање	Србија
Централизована систем залиха и потрошног материјала	Србија

Листа потпројеката по категоријама

КАТЕГОРИЈА ПОТПРОЈЕКТА - ЕИБ
Адаптација постојећих зграда и лабораторија - Пројекат за наставак изградње главне зграде Универзитета у Новом Саду - Поправка темеља - Хемијски факултет, Универзитет у Београду - Адаптација ИРТЦУД УНЕСЦО истраживачког центра , Београд - Адаптација зграде у Светозара Марковића 21, Београд (тренутно суспендована)
Истраживачка станица Петница и Кампус Математичке гимназије - Пројекат за реконструкцију, припајање, изградњу и опремање објеката у начној станици Петница - Пројекат за изградњу кампуса Математичке гимназије, Београд (тренутно суспендован)
Нова капитална опрема за истраживање - Пројекат набавке нове капиталне опреме за истраживање, суфинансирање са ЦЕБ 1 - Централизовани систем за евидентирање и набавку потрошног материјала и ситне опреме за научно-истраживачке активности
Програм за људске ресурсе у циљу привлачења скоро 1400 српских научника који раде у иностранству
Центар за промоцију науке, Београд - Пројекат- Центар за промоцију науке, Београд - Пројекат за изградњу Природњачког центра у Свилајнацу
Оснивање Центара изврсности у приоритетним истраживачким областима, енергетски сектор и енергетска ефикасност, заштита животне средине и климатске промене, Наука

о материјалима и нанонаука, пољопривреда и храна, биомедицина и информационо-комуникационе технологије. - Центар за матичне ћелије Медицинског факултета у Крагујевцу (отказан) - Пројекат набавке опреме за Наноцентар, Блок 39, Београд - Пројекат изградње Центара изврсности Универзитета у Крагујевцу
Модернизација академске рачунарске мреже и инфраструктуре за Суперкомпјутер иницијативу - Пројекат набавке опреме за Суперкомпјутер иницијативу
Нове стамбене зграде за младе истраживаче у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу - Пројекат изградње станова за младе истраживаче, блок 32 Београд, фазе 2 и 3 (суспендовано финансирање из ЕИБ средстава)
Изградња научно-технолошких паркова у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу - Пројекат изградње Научно-технолошког парка Звездара, Београд - Пројекат изградње Научно-технолошког парка у Новом Саду, фаза 1 - Пројекат изградње Научно-технолошког парка у Новом Саду, фаза 2 - Пројекат изградње Научно-технолошког парка у Крагујевцу (отказан)
Инфраструктура за Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Адаптација зграде у Светозара Марковића 21, Београд (тренутно суспендована)
КАТЕГОРИЈА ПОТПРОЈЕКТА - ЦЕБ 1
Компонента 1 (истраживачка опрема): куповина истраживачке опреме за јавне истраживачке јединице и лабораторије - Пројекат набавке нове капиталне опреме за истраживања, суфинансирање са ЕИБ
Компонента 2 (изнајмљивање смештаја за младе истраживаче): изградња некомерцијалних смештајних објеката за изнајмљивање младим истраживачима са циљем унапређења њихових животних услова - Пројекат за изградњу станова за младе истраживаче, блок 32 у Београду, фаза 1
ПОТПРОЈЕКАТ КАТЕГОРИЈА- ЦЕБ 2
Компонента 1: Оснивање Центара изврсности у приоритетним истраживачким областима - Изградња Центра за биомедицинска истраживања у Београду - Изградња и опремање Агробилошког и технолошког центра у Новом Саду - Изградња Института ветеринарских наука, Нови Сад - Изградња Центра за нове материјале и нанонауку, блок 39, Београд (суфинансирање са ЕИБ) - Пројекат изградње Наноцентра, блок 39, Београд - Изградња објекта института, блок 39, Београд
Компонента 2: изградња Научно-технолошког парка у Нишу

- Пројекат изградње Научно-технолошког парка у Нишу
Компонента 3: Изградња станова за изнајмљивање младим истраживачима у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду. - Пројекат изградње станова за младе истраживаче у Крагујевцу - Пројекат изградње станова за младе истраживаче у Нишу - Пројекат изградње станова за младе истраживаче у Новом Саду - Пројекат изградње станова за младе научне раднике, Блок 32, Београд, фазе 2 и 3
Компонента 4: Финансијска и техничка подршка за ЈУП.

Рок расположивости средстава по уговору о зајму који је закључен између Републике Србије и Европске инвестиционе банке истекао је 31. децембра 2015.год.

Рок расположивости средстава по уговору о зајму који је закључен између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ 1739) истекао је 30. јуна 2015. године.

Банка за развој Савета Европе је дописом од 01. децембра. 2014. године обавестила Републику Србију да је Одбор Банке одобрио продужење рока расположивости средстава зајма до 30. септембра 2018. године. Закључком Владе Републике Србије број 48-6679/2015 од 18. јуна 2015. године одобрено је продужење зајма и овлашћен је министар финансија Душан Вујовић да обавести Банку за развој Савета Европе о Закључку.

Р. Србија је иницирала продужење рока реализације Пројекта Истраживање и развој у јавном сектору до 2020. године. Влада Р. Србије је овластила министра финансија Душана Вујовића за покретање процедуре за продужење. Захтев за анексирање Финансијског уговора бр. 25,497 закљученог 2010. године између Р. Србије и Европске инвестиционе банке који садржи измену техничког описа Уговора, односно листу потпројеката, упућен је Европској инвестиционој банци 28. децембра 2015.год.

ТАБЕЛА ЗАВРШЕНИХ ПОТПРОЈЕКТА

Пројекат бр. 003	Назив потпројекта:	Завршетак изградње главне зграде Универзитета у Новом Саду
	Категорија потпројекта:	ЕИБ - Адаптација постојећих зграда и лабораторија
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ и Фонд за капитална улагања Војводине
	Локација	Нови Сад
	Статус потпројекта:	Објекат је завршен. Издата је употребна дозвола. Примопредаја радова са Извођачем радова је завршена у јуну 2013. године. Објекат је у функцији. Извршен је коначни обрачун вредности објекта за укњижење.
	Датум завршетка:	Август 2013.
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Бр.401-00-171/2110-01 10.09.2010.	Датум и број	13. септембар 2010. (451-03333/2010 Покрајинска администрација)
	Процењена вредност	4.000.000 евра - кредит ЕИБ, и 150.000.000 динара (око 1,250 000 евра) - Фонд за капитална улагања Војводине
	Стране уговора	Министарство просвете, науке и технолошког развоја Фонд за капитална улагања Војводине Аутономна Покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој Универзитет у Новом Саду Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди адекватан простор за централне службе Универзитета и Ректората, што значајно превазилази простор који су заузимали раније, модернизацију опреме која би омогућила нове услуге, испуњавање потреба запослених у управи и службама, студената и универзитетских професора, као и служби АП Војводине које се налазе у згради Универзитета.	
Изводљивости/одрживости студија	Н/А	

Изградња	Кратак опис објекта	Приземље главне зграде Универзитета састоји од амфитеатра, мултифункционалне дворане, Универзитетског клуба, централне библиотеке и просторије за рад Студентског парламента. Приземље се састоји од конференцијске сале, ИТ центра и просторије за рад централних универзитетских служби, док се други спрат састоји од канцеларија Универзитета за разне сврхе, укључујући кабинете ректора и проректора. Трећи спрат је дат на располагање оснивачу- Аутономној Покрајини Војводина, и користиће се за рад различитих агенција, служби од заједничког интереса за развој науке, образовање и међународну сарадњу у свим областима.
	Пројектна документација	Пројектна документација је припремљена од стране Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду.
	Извођачи	Термоинжењеринг д.о.о. Београд, Србија Интер-Коп Мишар д.о.о. - Шабац, Србија
	Вредност објекта по кончаном обрачуна:	Из средстава ЕИБ 3.065.217,30 € 318.430.709,45 РСД КОНТРИБУЦИЈА РС: Из средстава фонда АПВ 1.209.041,21 € 134.006.775,34 РСД Претходна улагања 994.116,48 € 95.610.644,06 РСД Вредност земљишта 1.808.610,93 € 218.668.296,00 РСД Трош. управљања пројектом 359.418,23 ЕУР 37.080.303,00 РСД УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБЈЕКТА 7.436.404,16 ЕУР 803.796,727,85 РСД
	Надзор	Универзитет у Новом Саду, Факултет

		техничких наука
	Примопредаја радова	Извршена августа 2013. год.

Завршени радови на изградњи Главне зграде Универзитета у Новом Саду



Пројекат бр. 006	Назив потпројекта:	Изградња Научно-технолошког парка у Новом Саду, фаза 1
	Категорија потпројекта:	ЕИБ - Изградња научно-технолошких паркова у Београду, Нишу, Новом Саду и

		Крагујевцу
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ и Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
	Локација	Нови Сад
	Статус потпројекта:	Потпројекат је завршен, издата је употребна дозвола. Примопредаја радова са Извођачем радова је завршена у септембру 2013. године. Објекат је у функцији. Извршен је коначни обрачун вредности објекта за укњижење.
	Датум завршетка:	Септембар 2013.
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Бр.401-00-171/2110-01 10.09.2010.	Датум и број	13. септембар 2010. (451-03333/2010 Покрајински администрација)
	Процењена вредност	Кредит ЕИБ: Међузбир1: 1.500.000 евра, фаза 1 МЕЂУЗБИР 2: 9.500.000 евра, фаза 2, види ПР007 УКУПНО ЕИБ: 11.000.000 евра Локално суфинансирање: 4.000.000 евра, фаза 2 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука УКУПНО: 15.000.000 евра, фазе 1 и 2
	Стране уговора	Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Фонд за капитална улагања Војводине; Аутономна Покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој; Универзитет у Новом Саду; Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука; ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди адекватан простор за студенте постдипломских студија на Факултету техничких наука, а који ће оснивати сопствене "spin-off" компаније у лабораторијама факултета.Ово је први корак ка будућим компанијама у оквиру Научно технолошког парка које ће бити у тесној вези са радом Факултета техничких наука.	
Студије	Н/А	

изводљивости/одрживости		
Изградња	Кратак опис објекта	Зграда Факултета техничких наука и Одељења за грађевински инжењеринг је пројектована као објекат са више нивоа (Сутерен + Пр +2 + Поткровље). Површина по спрату: Сутерен: 425.21м ² ; Приземље: 405.11м ² ; Први спрат: 437.65м ² ; Други спрат: 435.71м ² ; Поткровље: 426.17м ² .
	Пројектна документација	Пројектну документацију је припремио Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду.
	Извођач радова	Ратко Митровић-Дедиње д.о.о. Београд, Србија Форма Фарм инжењеринг Група д.о.о. Београд, Србија (бивши Хемофарм инжењеринг д.о.о.) Београд, Србија)
	Вредност уговора за извођење радова	110.700.776,51 динара - Основни уговор од 20. јуна 2011. 3.110.955,64 динара - Анекс 1 за додатне радове од 9. новембра 2011; 19.969.280,44 динара - Анекс 2 за додатне радове од 22. фебруара 2012; 1.725.676,57 динара - Анекс 3 за додатне радове од 16. октобра 2012; 2.866.693,71 динара - Суфицит/дефицит; УКУПНО: 138.373.382,87 динара.
	Надзор	Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
	Примопредаја радова	Извршена септембара 2013. год.
	Вредност објекта по коначном обрачуну	Из средстава ЕИБ 1.381.977,19 € 149.257.425,70 РСД КОНТРИБУЦИЈА РС: Претходна улагања € 362.786,90 РСД 36.689.349,56 Вредност земљишта € 38.970,20

		РСД 4.711.824,00 Трош. управљања пројектом 99.790,00€ 10.539.442,00 РСД УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБЈЕКТА € 1.883.524,29 РСД 201.198.041,26
--	--	---

Изградња Научно-технолошког парка у Новом Саду



Пројекат бр: 004	Назив потпројекта:	Изградња Научно-технолошког парка Звездара, Београд
	Категорија потпројекта:	ЕИБ - Изградња научно-технолошких паркова у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ-а и ЕУ Инструмент за претприступну помоћ
	Локација	Београд
	Статус потпројекта:	Потпројекат је завршен и објект је у употреби. Добијено Решење о употребној дозволи 02.06.2013. године. Зграду у једном делу користи ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд , који је привремено управљао објектом до краја 2015. године у име МПНТР. Примопредаја радова са Извођачем радова је завршена у јануару 2015. године. Научно-технолошки парк Београд д.о.о. је формиран, а власничку структуру чине Р. Србија, Град Београд и Универзитет у Београду. Примопредаја између ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд и Научно технолошког парка Београд извршена је 13.01.2016. год. Коначан извештај о реализацији пројекта достављен је МПНТР 21.01.2016. год. Објект је у функцији. Извршен је коначан обрачун вредности објекта за укњижење.
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	29. октобар 2010. (163 ЈУП, 401-00-207/2010-01 Министарство науке и технолошког развоја)
	Процењена вредност	3.817.000 евра - легализација, комунални прикључци и накнада за организацију локације 13.500.000 евра - техничка контрола главних пројеката, изградње, надзора и техничког прегледа УКУПНО: 17.317.000 евра

	Стране уговора	Министарство просвете, науке и технолошког развоја ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да пружи инфраструктурну подршку новооснованим компанијама базираним на иновацијама које проистичу из научних истраживања и директних инвестиција високо технолошких компанија у истраживање и развој. Значајна пословна подршка је осмишљена за мала инкубатор предузећа којима се омогућава да користе услуге парка по повољним условима током прве три године од њиховог оснивања.	
Студије изводљивости/одржиости	Студија изводљивости је била припремљена 2010. године од стране консултантске куће COWI.	
Изградња	Кратак опис објекта	Комплекс се састоји од пет модуларних зграда, заједничког улазног хола са прикључним објектима и стазама које повезују модуларне објекте. Укупна бруто површина комплекса је 14.315м ² . Парк ће понудити заједничке службе - финансијска, правна, одржавање зграде, сале за састанке, пријем и друге заједничке просторије.
	Пројектна документација	Пројектну документацију је израдио МЕРЕХ, Београд, а чија је израда финансирана средствима ЕУ.
	Извођачи	Денеца М инжењеринг д.о.о.Београд, Србија Пројектомонтажа а.д, Београд, Србија Архи. Про д.о.о. Београд, Србија
	Процењена укупна вредност грађевинских радова	€ 14.004.706,76
	Надзор	ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
	Вредност објекта по коначном обрачуну	Из кредита ЕИБ за објекат 14.392.402,73 € 1.539.550.500,35 РСД За ситну опрему за одржавање 15.253,13 € КОНТРИБУЦИЈА РС: Претходна улагања € 2.769.519,42 297.363.300,00 РСД

		Трош. управљања пројектом 1.138.670,00 € 120.452.146,00 РСД УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБЈЕКТА 18.300.621,15 € 1.957.342.256,35 РСД
--	--	---

Изградња Научно-технолошког парка Звездара, Београд



Пројекат бр. 001	Назив потпројекта:	Изградња Природњачког центра Свилајнац
	Категорија потпројекта:	ЕИБ
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ Република Србија (Општина Свилајнац) 1.086.601,00 еура Кредит од ЕИБ 5.993.191,00 еура УКУПНО без ПДВ-а 7.079.792,00 еура
	Статус потпројекта:	Овај потпројекат је завршен. Зграда је предата на управљање крајњем кориснику. Примопредаја радова са Извођачем је завршена у децембру 2013. године, а у наредном периоду је извршено опремање. Објект је у функцији. Набављена је опрема - мултифункционална бине са озвучењем, расветом и систем за симултано превођење. Примопредаја опреме је извршена 25.09.2015.г
	Датум завршетка:	Децембра 2012.год. (завршени сви грађевински радови). Јула 2014.год. – набављена је опрема за кухињу ресторана и соба за посетиоце, као и делови за изложбе у затвореном.
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	8. март 2011. (359 ЈУП, 401-00-40/2011-01 Министарство науке и технолошког развоја) 21.03.2014. Анекс 1 уговора бр. 401-00- 279/2014-01
	Процењена вредност	На основу Анекса 1 уговора 6.275.688,78 евра и то: стручни надзор, извођење радова на изградњи, комунални прикључци, сагласности и други трошкови у вези са реализацијом изградње 4.748.698,00 еура, вредност експоната и опреме 1.500.000,00 еура и израда идејног решења и пројекта конструкције 26.990,78 еура.
	Стране уговора	Министарство просвете, науке и технолошког развоја Општина Свилајнац ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд

Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди простор за размену идеја и искустава у различитим дисциплинама и да иницира нове врсте истраживања у бројним научним областима, као што су геологија, климатологија, екологија, палеонтологије, хемије, биологије, физике и слично. Наука није циљ за себе, већ резултати који ће имати практичну примену. Велики број заступљених научних грана ће омогућити широк спектар различитих врста истраживања за која се очекује да ће довести до бројних значајних открића за целу Србију.	
Студије изводљивости/одрживости	Студију изводљивости (укључујући и бизнис план) припремила је општина Свилајнац 2010. год. као и дизајн унутрашње изложбе коју је припремио Природњачки музеј у Београду 2012. год. Бизнис план је припремила ТА 2014. год.	
Изградња	Кратак опис објекта	Главна зграда Центра има бруто површину од 3.000м². Научни и забавни парк иза главне зграде ће излагати еволутивни развој планете Земље и вулкана, праисторијски водени свет, биосферу наше планете, живот сисара и палеонтолошко наслеђе Србије. Обухвата површину од 15.000 м². Главна зграда обухвата неколико функционалних блокова како следи: - блок за научна истраживања који обухвата радионице - лабораторије за истраживачки рад експерата у посети, студената, деце средњих или основних школа. - образовна и изложбена јединица садржи изложбени простор са експонатима из различитих периода развоја планете Земље. - комерцијални блок нуди различите услуге. - административни блок се састоји од просторија за рад особља задужених за функционисање научно-истраживачког центра. - технички блок се састоји од просторија намењених за функционисање објекта, у техничком и технолошком смислу. - помоћне собе и комуникације.
	Пројектна документација	Пројектна документација је припремљена од стране општине Свилајнац
	Извођач радова	Маринко д.о.о. Свилајнац, Србија Интерклима д.о.о. Врњачка Бања, Србија
	Надзор	ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд

	Примопредаја радова	Децембра 2012 - радови на главној згради, у јулу 2014. године, укључујући ставке из Анекса 1 Уговора. Свечано отварање изложбе у приземљу било у априлу 2015. Изложба у горњем спрату ће се развијати касније, према расположивим средствима општине.
	Укупна улагања до сада	Из средстава ЕИБ € 6,257.378,43 РСД 680.415.965,74 Контрибуција РС: Плаћено из средстава РС РСД 25.55.465 € 214.722 Трошкови управљања: РСД 48.447.624 € 427.101 Вредност земљишта: РСД 102.533.592 € 874.850 УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБЈЕКТА € 7.774.052 РСД 856.956.647

Изградња Природњачког центра у Свилајнцу



Пројекат бр 008	Назив потпројекта:	Реконструкција, проширење, изградња и опремање Истраживачке станице Петница
	Категорија потпројекта:	ЕИБ - Истраживачка станица Петница и кампус Математичке гимназије
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ-а и ЕУ Инструмент за претприступну помоћ
	Локација	Ваљево
	Статус потпројекта:	Потпројекат је завршен, добијена употребна дозвола и извршена примопредаја радова. Примопредаја радова са извођачем извршена је априла месеца 2015.год. Нове просторије користи ИС Петница. Објекат је у функцији. Решење о употребној дозволи издато 05.03. 2014.године
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	27. децембар 2010. (344 ЈУП, 401-00-249/2010-01/1 Министарство науке и технолошког развоја)
	Процењена вредност	6.000.000 евра - изградња, надзор и технички преглед 1.125.921,80 евра - набавка намештаја, кухиње, вешераја, опрема за уређење 301.403 евра - ИТ опрема 1.612.739,60 - лабораторијска опрема УКУПНО: 9.040.064,40 евра
	Стране уговора	Министарство просвете, науке и технолошког развоја; ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен како би се реконструисали и даље изградили постојеће објекти у оквиру комплекса Истраживачке станице Петница, као и ради набавке потребне опреме. Ово ће помоћи побољшању нивоа услова рада у циљу укључивања квалитетних образовних садржаја у научне области заступљеним у Петници, омогућујући Центру да спроводи програме и активности у складу са стандардима (останак, исхрана, рад, безбедност, и сл.) који постоје у другим европским земљама.	
Студије изводљивости/одрживости	У септембру 2010. год. Студију изводљивости је припремио конзорцијум COWI и „Подршка инфраструктури, Прозор за техничку помоћ (ИПФ ТА) Западном Балкану“ коју финансира ЕУ. Студију је ревидирала и ТА.	
Изградња	Кратак опис објекта	Комплекс се састоји од смештајног објекта капацитета од 170 кревета, кабинета и

		складишта за археологију, нову физику, биологију и хемијских лабораторија површине 1.300 м² као и планетаријума, конгресне сале, реконструисаног наставног/ едукативног центра, библиотеке, изложбеног простора од 500 м² друштвеног клуба и продужене модернизоване кухиње. - Смештајни објект (брuto површине од 3.478,81 м²); - Лабораторије (брuto површине од 1,514.22 м²); - Ресторан са галеријом (брuto површине од 1,305.79 м²); - Едукативни центар (брuto површине од 1,235.33 м²); - Библиотека брuto површине од 444.92м; - Уређене површине
	Пројектна документација	Пројектна документација је финансирана од стране ЕУ
	Извођач радова	Пројектомонтажа ад Београд, Србија Архи.Про д.о.о., Београд, Србија
	Надзор	ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
	Примопредаја	Извшена априла 2015. год.
	Укупна улагања до сада (радови и опремање)	Из средстава ЕИБ 8.727.500,89 € РСД 948.092.835,63 Контрибуција РС Трошкови финансирања РСД 67.622,00 Трошкови управљања пројектом РСД 67.089.493,00 € 630.808 УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБЈЕКТА € 9.358.309,00,00 РСД 1.015.249.951.00

Реконструкција, проширење, изградња и опремање Истраживачке станице Петница



Пројекат бр. ПР010	Назив потпројекта:	Изградња станова за младе научне раднике, блок 32, Београд, 1 фаза
	Категорија потпројекта:	ЦЕБ 1 - Компонента 2 (изнајмљивање станова младим истраживачима): Изградња

		некомерцијалних објеката за изнајмљивање младим истраживачима са циљем унапређења њихових животних услова
	Извор финансирања:	Већим делом из ЦЕБ1 кредита (8,559,749 EUR), мањим делом из ЕИБ кредита (13,858 EUR)
	Локација	Нови Београд
	Статус потпројекта:	Радови су завршени у децембру 2014. године. Примопредаја радова између Извођача, Наручиоца и Инвеститора је завршена 6.03.2015. године. Објект је у функцији. Добијено Решење о употребној дозволи 26.02.2015.године.
	Датум завршетка радова:	Грађевински радови су завршени у априлу 2014. год., а прикључак на трафо станицу и спољну дистрибутивну електро-мрежу у децембру 2014. год.
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	14. март 2011. (397 ЈУП, 011-00-26/2011-01/2 Министарство науке и технолошког развоја)
	Процењена вредност	МЕЋУЗБИР 1: 10.000.000 евра, фаза 1; МЕЋУЗБИР 2: 9.200.000 евра, фаза 2, види и ПР023; (ПОДЗБИР 3: 6.465.000 евра, фаза 3 уговор са МПНТР недостаје, види ПР025, ЦЕБ2 финансирање) УКУПНО: 25.000.000,00 евра
	Стране уговора	Министарство просвете, науке и технолошког развоја ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен како би се обезбедиле јефтине стамбене могућности за младе истраживаче, чиме се смањује њихова тенденција да напусте земљу, односно смањење „одлива мозга“.	
Студије изводљивости/одрживости	Н/А	
Изградња	Кратак опис објекта	Прва фаза је обухватала почетак изградње зграде 3Б са укупно 134 станова, 17 пословних објеката и 57 паркинг места са укупном површином од 16.270,45 м ² бруто површине. Број спратова: Сутерен + Пр +5 +

		Поткровље
	Пројектна документација	Пројектна документација је припремљена од стране Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника Универзитета у Београду као Инвеститора. Израдио Саобраћајни институт ЦИП Београд.
	Извођач радова	Денеца М инжењеринг д.о.о. Београд, Србија
	Надзор	ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
	Примопредаја радова	Извршена марта 2015. год.
	Процењена укупна сума До сада уложено и вредност по коначном обрачуна:	8,608.120,68 € Из средстава ЕИБ ЕУР 13.851,11 608.120,68 € Из средстава ЕИБ € 13.851,11 РСД 1.417.009,58 Из средстава ЦЕБ1 € 8.469.761,72 РСД 951.852.679,68 Остаје да се уплати депозит по коначној ситуацији динарска противвредност € 648 Контрибуција РС: Трошкови РСД 420.681,47 Претходна улагања € 1.744.027,14 РСД 210.098.589,15 Трошкови управљања € 681.141,00 РСД 75.843.522,00 Вредност земљишта € 2.880.000,00 РСД 234.000.000,00 УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБЈЕКТА € 13.790.120,52 РСД 1.473.712.185,88

Изградња станова за младе научне раднике у Блоку 32, Нови Београд, Фаза 1





Пројекат бр. 022	Назив потпројекта:	Поправка темеља - Хемијски факултет Универзитета у Београду
	Категорија потпројекта:	ЕИБ - Адаптација постојећих зграда и лабораторија
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ
	Локација	Београд
	Статус потпројекат:	Овај потпројекат је завршен (радови). Корисник користи реновирану зграду. Записник о примопредаји радова са Извођачем потписан једнострано. Извођач потражује додатне радове које није одобрио стручни надзор ни Наручилац и одбија да отклони недостатке, па није сагласан са Записником о примопредаји радова. Према записнику о примопредаји радова укупна вредност радова који су изведени износила је 61.240.961,00 динара. Извођачу је плаћено 55.116.864,90 динара, односно казна пенала од 10% у износу од 6.124.096,10 динара је одбијена. Извођач одбија да достави сву документацију због чега је са извођачем извршена једнострана примопредаја радова. Постоје недостаци на делу изведених радова на платоу, појава улегнућа услед слегања подтла. Извођач одбија да изврши поправку. МПНТР је прослеђен допис у вези поменутог потпројекта са предлогом да се изврши утврђивање узрока поновног слегања тла и санације истог.
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум завршетка радова:	Новембар 2013. год.
	Датум и број	27. јун 2011. (бр. 1206 – ЈУП Истраживање и развој Београд)
	Процењена вредност	800.000 евра
Циљеви потпројекта	Стране уговора	Министарство просвете, науке и технолошког развоја; ЈУП Истраживање и развој д.о.о . Београд
	Овај потпројекат је осмишљен како би се спречила даља оштећења услед слегања зграде Хемијског факултета у Београду и да се елиминишу могући утицаји лесних пригушења која изазивају даља улегнућа зграде. Поправка темеља им	

	а за циљ да уклони ризик од угрожености стабилности објекта и да створи услове за несметан рад корисника зграде.	
Студија изводљивости/одрживости	Н/А	
Изградња:	Кратак опис објекта	Постоји седам факултета у поменутој згради: Хемијски факултет, Математички факултет, Физички факултет, Факултет за физичку хемију, део Рударско геолошког факултета, Биолошки факултет и Географски факултет. Радови на поправци темеља су подразумевали утискивање шипова испод постојећег темеља зграде. Радови су завршени и објекат је у употреби. Извођачу радова је наложено да изврши санацију оштећеног дела плочица на колони и утврди узроке накнадног слегања. Сачињен је једнострано записник о примопредаји радова, извођач није доставио сву захтевану документацију за примопредају и није сагласан са записником.
	Пројектна документација	Пројектна документација је припремљена од стране Хемијског факултета у Београду, и добијена је пре објављивања позива за подношење понуда. Због додатних захтева Градског завода за заштиту споменика културе, припремљен је пројекат за замену плочица испод колоне и замену и обнову споменика „Главњача“. Посебне објаве о јавним набавкама су биле припремљене за ове пројекте и за радове који се односе на њих, а који се финансирају у оквиру пројекта. Након инспекције стања објекта, након завршених радова на темељима, обавештење за набавку је објављено ради обнове/адаптације горњих делова (спрат) и доњих делова (подрумски плафон) у одговарајућим просторијама како би се спречило да активности на факултетима буде угрожене или доведене у опасност.
	Извођач радова	ГП Мостоградња ад у реструктурирању, Београд, Србија ГЕОМЕХАНИКА доо Београд, Србија

	Планирано до завршетка	1.159.039 динара (вишак радова)
	Укупна улагања	Финансирано из средстава ЕИБ € 679.174,66 РСД 76.587.133,15 Контрибуција РС € 67.447 РСД 7.529.578 УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБЈЕКТА € 746.622,29 РСД 84.116.711,15
	Надзор	Грађевински факултет Универзитета у Београду Провекс (електричне инсталације) ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд (радови на водоводним и канализационим инсталацијама) Завод за заштиту споменика културе града Београда (археолошки и конзервацијски надзор)

Поправка темеља Хемијског факултета у Београду

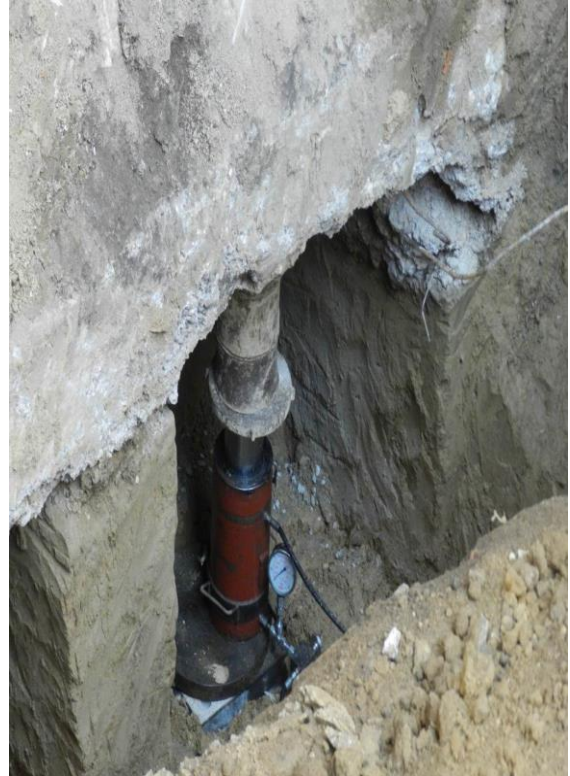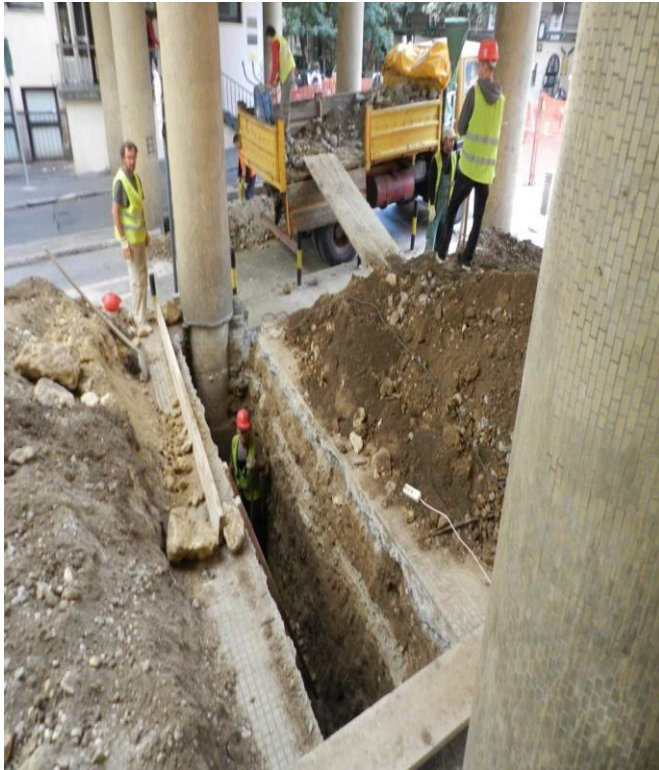

ТАБЕЛА ПОТПРОЈЕКТА У ТОКУ
(на основу потписаних уговора о реализацији између МПНТР и ЈУП)


Пројекат бр. 017	Назив потпројекта:	Центар за промоцију науке, блок 39
	Категорија потпројекта:	ЕИБ - Центар за промоцију науке, Београд
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ-а и ЕУ Инструмент за претприступну помоћ
	Локација	Нови Београд
	Статус потпројекта:	Потпројекат у припреми (Фаза главног пројекта). Фаза израде пројектне документације није завршена. Републичка ревизиона комисија је 17.08.2015. доставила извештај по коме је предметна техничка документација неприхватљива. МПНТР је решењем формирало радну групу за утврђивање спроведених административних, техничких и финансијских процедура у вези пројекта изградње Центра за промоцију науке. Радна група Министарства просвете, науке и технолошког развоја уз подршку представника ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд је израдила извештај о статусу потпојекта 11.02.2016.г.
	Планирани завршетак:	Децембар 2018. (потребно је продужење ЕИБ зајма)
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	8. март 2011. број 04-00-26/2011-01/4 (ЈУП бр. 399 од 14. марта 2011.
	Процењена вредност	65,000,000 евра - пројектовање, изградња, опремање, надзор и технички преглед.
	Стране уговора	Министарство за образовање, науку и технолошки развој ЈУП Истраживање и развој доо Београд
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је део Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за 2010-2015. и усклађен је са Европском стратегијом 2020. Један од циљева потпројекта је да се омогући српским научним институцијама и научницима да постану кључни актери који доприносе постизању одрживог знања, просперитета и економског развоја земље.	

	Изградња Центра за промоцију науке покренута је са намером да се створи окружење у којем јавност може да се упозна и сусретне са науком кроз занимљив и едукативан садржај. Центар је пројектован тако да игра важну улогу у неговању економије засноване на знању.	
Изводљивости/одрживости студије	У августу 2010. године у оквиру пројекта који финансира ЕУ „подршка инфраструктурним пројектима, прозор за техничку помоћ (ИПФ ТА), Западни Балкан“, ТАЗ-СРБ-СПЦ-01, студија изводљивости је спроведена од стране конзорцијума COWI, Београд и Подршка инфраструктурним пројектима (ИПФ). Као компонента Ц, студија је била део већег програма студија изводљивости у припреми „Иницијатива за инфраструктурно улагање у сектор истраживања и развоја у оквиру јавног сектора. ИПФ-ТА програм је финансиран у оквиру Еуропе Аид /128073 /Ц/СЕР/МУЛТИ. У 2014. Студија изводљивости је ажурирана од стране Центра за промоцију науке и Економског института која представља Студију изводљивости и одрживост засновану на резултатима Идејног пројекта, што је важно јер се бруто површина значајно повећала. У циљу одобрења од стране Комисије за ревизију у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Студију је још једном ажурирала БВК компанија, из Београда.	
Изградња	Дозволе	- Локацијска информација бр.350-03-0080/2011 од 31. јануара 2011. године издату од стране Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, - Решење о локацији/дозвола за планирање бр. 350-01-00888/2011-07 од 21. децембра 2011, издат у Републици Србији - Министарство просвете и науке. - Одлука о посебној грађевинској дозволи за припремне радове бр. 350-03-00354/2012-07 од 25. јуна 2011. године, издата у Републици Србији - Министарство просвете и науке.
	Корисник	Центар за промоцију науке
	Кратак опис објекта	Центар за промоцију науке је пројектован као комплекс зграда са шест основних функција: изложбени простори, планетаријум, конференцијска сала, научни клуб, дечији научни клуб и парк науке. Ови простори служе за појединачне функције, приступ и интеракцију кроз главне зоне рецепције где се налазе друге услужне и пратеће функције. Грађевина има јасно одвојен и логичан ток кретања посетилаца и особља Центра. Особље може да приступи свим функционалним јединицама без пролаза кроз или коришћења јавног простора. Јединице области, у зависности од њихове намене, састоје се од следећег: - Фоаје, инфо пулт, свлачионица, соба за

		прву помоћ, лифтови и степеништа, сувенири и књижара, кафе, пријемни пулт, - Изложбене области (сталне и привремене изложбене области, - Области за паузе и одмор, научни клуб (4 лабораторије за биологију, хемију, физику и електронику са потребном опремом, флексибилан простор), тоалети за посетиоце, - Конференцијска сала (мултифункционална сала са 250 седишта), планетаријум (планетаријум сала са куполом и 120 места), - Ресторан/кантина (кухиња са пултом за узимање obroka и касе), канцеларија шефа канине, управе и администрације, - Одржавање (радионице за поправке и одржавање, канцеларијски простор, чистионица, безбедносно контролне собе, заједничке просторије за особље, тоалети и друге пратеће просторије, техничке јединице, транспортне линије, гардероба, клозет, - Подземна приступа зона, паркинг простор и простор за утовар/истовар, област за одлагање отпада, обезбеђење улаза/контролна соба, складишни простор за експонате.
	Пројектна документација	Урбанистички пројекат за изградњу Центра за промоцију науке, Научног института и Наноцентра у блоку 39 на Новом Београду, чији је руководиоца главног пројекта Завод за урбанизам Београда, Палмотићева 30, направљен у складу са Мастер планом Београда 2021.(Сл. лист града Београдабр. 27/03, 25/05, 63/09). - Припрема идејног архитектонског решења, идејног пројекта, главног пројекта и тендерске документације је поверена архитектонском бироу господина Волфганг Тсцхапеллер, Линденгасе 38/6-1070 Беч, Аустрија, као победника конкурса за идејно-архитектонски пројекат за Центар за промоцију науке у марту 2012, у износу од ЕУР 2,349,000 и максималног буџета пројекта за изградњу од 34,270,000 евра. - Анекс 2 уговора за услуге пројектовања додатних делова подземних нивоа 1 и 2 потписан је у новембру 2012. у износу од 166.600,00 евра потписан је у октобру 2013. доделом додатног рока за фазу Главног пројекта и ограничавајући максимални износ накнаде за консултанта за пројектовањеу случају раскида уговора од стране Наручиоца. Идејни пројекат је условно одобрен у

		септембру 2013. Ревидирано решење је предато јула 2014. год. узимајући у обзир измењен безбедносно пожарни концепт за горње делове зграде. Идејни пројекат је одбијен од стране Републичке ревизионе комисије као неприхватљив. Главни пројекат је завршен 90% и урађена је техничка контрола пројекта.
	Извођач радова	Након завршетка пројектне документације, извођач радова ће бити изабран у отвореном међународном надметању у складу са прописима Европске инвестиционе банке.
	Надзор	Пре почетка изградње спровешће се ЈН за избор услуге стручног надзора
	Процењена укупна вредност радова	42.000.000,00 евра (не укључују инфраструктурне прикључке на Блоку 39
	Вредност инвестиције	Н/А радови још нису почели
	Планирана примопредаја радова	Децембар 2018. године
	Процењени трошкови	изградња: EUR 42 million; опремање EUR 17 million, комунални прикључци : EUR 3 million and Дизајн и остале услуге око: EUR 3 million
	Укупно:	EUR: 65, 000,000 (што не укључује градске инфраструктурне таску од 5,000,000 евра)
	До сада уложено:	За пројектовање и припрему изградње објекта € 3.024.364,81 РСД 349.160.388,99 За опрему ЦПН € 631.179 РСД 72.099.223,09 Укупно уложено: € 3.655.543,81 РСД 421.259.612,08

Центар за промоцију науке, Београд

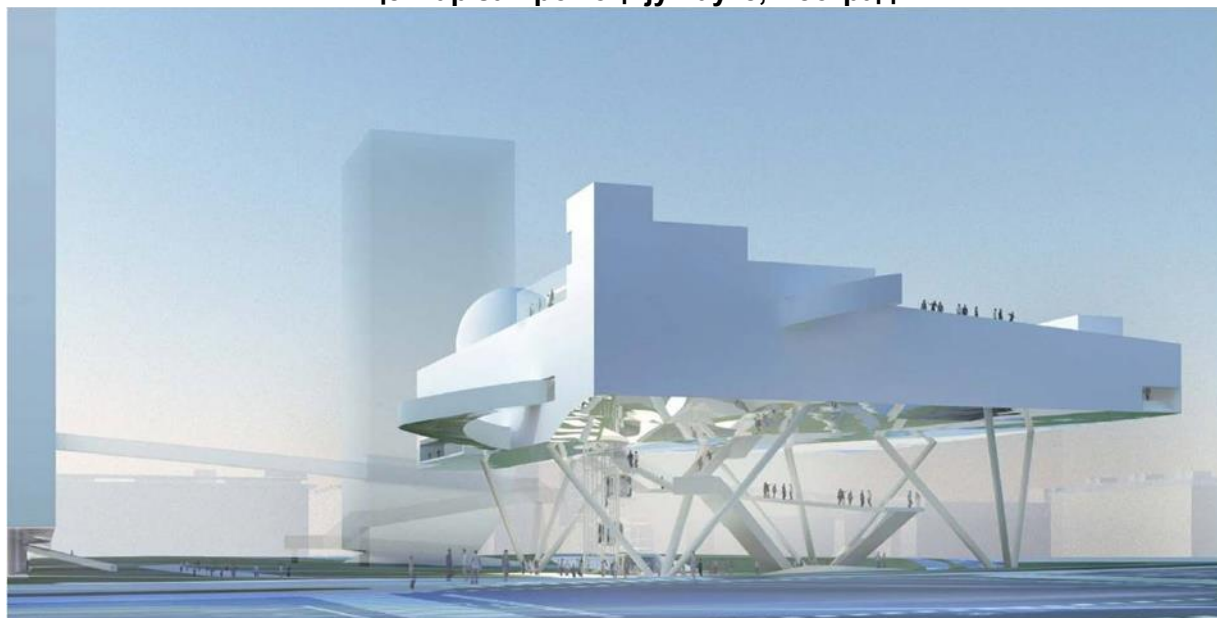

Пројекат бр.016	Назив потпројекта:	Нова капитална опрема за истраживање
	Категорија потпројекта:	ЕИБ - Нова капитална опрема за истраживање ЦЕБ - Компонента 1 (истраживачка опрема): куповина истраживачке опреме за јавне истраживачке јединице и лабораторије
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ (25,000,000 =50%) и ЦЕБ1 (25 000 000= 50%)
	Локација	Србија
	Статус потпројекта:	60% од процењене вредности потпројекта је уговорено средином 2013. год. Остала опрема је подељена у четири тендера (А, Б, Ц и Д). Тендери А и Б, расписани су 2013/2014, били су неуспешни. У току је набавка капиталне опреме чија је процењена вредност 20.000.000,00 евра, са пројекцијом закључења уговора до средине 2016. Године (тз. тендери Ц и Д). У оквиру набавке IOP/3-2015/NCE/1 (тендер Ц) организоване у 120 лотова, чија је процењена вредност 16.000.000 евра, за (15 лотова-15 уређаја), закључени су уговори у вредности од 495.560,00 евра. За лотове за које су у отвореном поступку пристигле понуде (65 лотова-751 уређаја), а за које је након стручне оцене утврђено да нису прихватљиве, поступак јавне набавке је обустављен. За исте лотове покренута је нова јавна набавка у преговарачком поступку бр. NPL/01-2015/NCE/1 са процењеном вредношћу од 8.541.666,67 EUR и пројекцијом за закључење уговора у априлу 2016. године. За поменути преговарачки поступак извршене су I и II фаза преговарања и урађена је стручна оцена понуда. Закључени су уговори за 18 лотова, који обухватају 308 комада опреме, у вредности од 3.345.021,00 евра (Уговори су закључени након 13.06 уз дозволу МПНТР).. За лотове за које у отвореном поступку није поднета ниједна понуда, покренут је преговарачки поступак бр. NPL/03-2015/NCE/1 (40 лотова-353 уређаја), са процењеном вредношћу од 4.083.333,33 евра и пројекцијом за закључење уговора у јулу 2016. године. Отварање понуда је било 09.03.2016. Уговори су закључени за 5 лотова у укупној вредности

		од 140.799,00 евра. У оквиру набавке бр. ИОР/09-2015/NCE/2 организоване у 48 лотова (66 уређаја), чија је процењена вредност 3.927.540.36 евра, отварање понуда спроведено је 29.02.2016. године и достављене су понуде за 46 лотова. Стручна оцена понуда је завршена и Извештај о стручној оцени понуда је послат ЕИБ на „по objection“. Закључени су уговори за 26 лотова ,који обухватају 41 комад опреме, укупне вредности 2.273.567,79 евра.
	Планирани завршетак:	Децембар 2015. (када се завршава пројектни циклус)
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	28. новембар 2011. број 451-02-3991/2011-14
	Процењена вредност	50.000.000 евра плус: Анекс Уговора 451-03-2229/2013-14 потписан 18/07/2013. год за набавку 1520 комада научне литературе и 2 650 књига у електронском формату. Анекс 2 660-04-28/2015-14 од 17.04.2015. – продужење рока до 31.12.2015.
	Стране уговора	Министарство просвете, науке и технолошког развоја; ЈУП Истраживање и развој доо
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да пружи стручну, административну и инфраструктурну подршку приликом куповине и управљањем опреме набављене за потребе научних и истраживачких институција, научних и технолошких паркова и Наноцентра Србија. Набављена опрема је подељена у неколико група, у зависности од вредности и начин набавке: - Капитална опрема од изузетног значаја вредности преко 100.000 евра, - Опрема вредна 30.000 евра до 100.000 евра - Опрема у вредности испод 30.000 евра, софтверске апликације и рачунари.	
Опис потпројекта	Евидентирање	Стручни тим ЈУП-а је креирао софтверску апликацију која је омогућила аналитички преглед и ажурирање почетних услова за набавку опреме. 5.700 захтева преузетих са сајта Министарства, као неформатирана информација и преведена у интернет базу података, доступну свим истраживачима, где је сваки део опреме заведен под својим идентификационим бројем.
	Корисник	Научна заједница у Србији

		• Набавка опреме за 784 пројекта одабраних на јавном конкурс за циклус 2011-2015 • 123 научно истраживачке институције • 784 руководиоца – 2000 ко-руководиоца пројеката • 12500 истраживача
	Процена захтева	У сарадњи са Радном групом коју је формирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, сви примљени захтеви за опрему су оцењени и подељени у три групе: одобрен, делимично одобрен и одбијен.
	Процењена укупна сума	57.500.000 евра (што је знатно више у односу на прелиминарне процене и буџет)
	Вођа пројекта	ЈУП Истраживање и развој доо
	Процењена укупна сума	50.000.000 евра (по основу потписаног уговора)
Јавне набавке		међународни и национални отворени поступак, међународни преговарачки поступак са листом кандидата, Процедуре за мале набавке.
	Уговорена опрема до новембра 2016. год.	Потписани су уговори са добављачима до сада у укупној вредности од 35,342 мил € а плаћено укупно 30,163 мил € и то: из средстава ЕИБ € 17.151.849,23 РСД 1.970.610.099,42 из средстава ЦЕБ1 € 12.973.999,40 РСД 1.506.262.366,54 и из осталих средстава РС € 37.985,50 РСД 4.306.619,91

Пројекат бр 002	Назив потпројекта:	Изградња Наноцентра, блок 39, Београд
	Категорије потпројекта:	ЕИБ - успостављање центара изврсности у областима истраживања са приоритетом на енергетском сектору и енергетској ефикасности, заштити животне средине и климатским променама, науци о материјалима и нанонауци, пољопривреди и храни, биомедицини и информационо-комуникационим технологијама. ЦЕБ2 - Компонента 1: Успостављање центара изврсности у истраживачкој области са приоритетом - Изградња центра за биомедицинска истраживања у Београду - Изградња и опремање агробиолошког и технолошког центра у Новом Саду - Изградња Центра за нанонауку и нове материјале у Београду
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ и ЦЕБ2 ЕУР 10 мил.
	Локација	Нови Београд
	Статус потпројекта:	Завршена је израда главног пројекта и чека се завршетак рада републичке ревизионе Комисије и доношење коначног извештаја на достављени Идејни пројекат, јер је позитивно мишљење ревизионе комисије услов за завршетак уговора о пројектовању, као и уговора о техничкој контроли главног пројекта.
	Планирани завршетак:	Децембар 2018. год.
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	14. март 2011. (396 ЈУП, 011-00-26/2011-01/1 Министарство науке и технолошког развоја)
	Процењена вредност	20.000.000 евра - изградња објекта (укључујући подземни паркинг и повезана инфраструктура) 20.000.000 евра - опрема, видети такође ПР027 УКУПНО: 40.000.000 евра
	Стране уговора	Министарство образовања, науке и технолошког развоја

		ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да побољша истраживања у области нанонауке, нових материјала, микро израда, промоција докторских и пост-докторских истраживања са савременом инфраструктуром у лабораторијама, што је у складу са стандардима Европске истраживачке области (ЕРА) са стратешким циљем да допринесе Европском стратешком форуму на плану истраживачке инфраструктуре (ЕСФРИ).	
Студије изводљивости/одрживости	Студија одрживости за Наноцентар спроведена је 2012. од стране групе научних саветника које је обезбедила техничку помоћ (ЕУ ХЕТИП). Студија је ажуриран у октобру 2013. године.	
Изградња	Кратак опис објекта	Према идејном пројекту, зграда Центра за нанонауку и нове материјале у блоку 39 на Новом Београду је организационо подељена на два ентитета, од којих прва је углавном окупирана лабораторијама са тешком опремом, а друга се углавном састоји од лабораторија са лаког опремом и канцеларијама. Идејно решење и технолошки пројекат су направљени у сарадњи са домаћим научницима из области нових материјала и нанонауке. Резултат је сажет у Студији о реализацији пројекта за изградњу и организацију НаноЦентра Србије (тзв. "План пута"). Главни пројекти су завршени током лета 2014. год. Техничка контрола од стране независног консултаната је завршена. Главни пројекат је завршен и предат 29.08.2013. године. Ревизиона комисија Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре није дала сагласност на Идејни пројекат због нерешене парцелизације и жалбе Факултета драмских уметности.
	Пројектна документација	Идејни пројекат и главни пројекат израдио пројектни тим Елкомс, Дизајн Архитектура, COWI-уговор о пројектовању од 06.02.2012.године у вредности од 16.873.931,60 динара без ПДВ-а
	Извођач радова	Извођење припремних радова и стабилизација терена за изградњу објекта у Блоку 39 на Новом Београду у оквиру подпројекта "Центар за промоцију науке у Београду", Србија Припремни радови и стабилизација тла већ су окончани у фебруару 2013. Извођачи су били следећи:

		Градинг д.о.о. Параћин, Србија Минел Динамо д.о.о. Београд-Барајево, Србија Интерклима д.о.о. Врњачка Бања, Србија Након завршетка пројектно техничке документације може се спровести поступак ЈН за извођење радова на изградњи објекта.
	Надзор	ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
	Планирана примопр. радова	децембар 2018.
	Процењена укупна сума Уложено у локацију и потпројекат:	22.000.000 евра (само радови и не укључује градске таксе) Из средстава ЕИБ ЕУР 1.412.955,81 РСД 160.151.442,20

Наноцентар, блок 39, Нови Београд



Пројекат бр 023	Назив потпројекта:	Централизовани систем за залихе и набавке потрошних материјала и ситне опреме за научно-истраживачке активности
	Категорија потпројекта:	ЕИБ - Нова капитална опрема за истраживања
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ
	Локација	Србија
	Статус Потпројекат:	У току
	Планиран завршетак:	Децембар 2015. год.
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	26. јануар 2012. број: 481-03-689/2012-14 и 27.06.2012. бр 404-01-72/2012-14
	Процењена вредност	40.000.000 евра
	Стране уговора	Министарство просвете, науке и технолошког развоја ЈУП Истраживање и развој доо
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да евидентира и наручи потрошне материјале за научне пројекте. За потребе ефикасног прикупљања, евидентирања и процене потреба научне заједнице, развијена је електронска база за наручивање потрошног материјала, омогућавајући приступ свим руководиоцима пројекта и руководиоцима сарадницима. Након евалуације примљених налога, поступак куповине се одвија кроз међународне процедуре отвореног надметања, или кроз мале процедуре набавке за робу која, због својих специфичности, не може се набави путем тендера.	
Опис потпројекта	Евидентирање	Преко електронске базе за прикупљање налога која је развијена у ЈУП Истраживање и развој
	Корисник	Научна заједница и ЈУП
	Процена захтева	Стручни тим ЈУП-а
	Поступак набавке	Међународне и домаће отворене процедуре надметања Мале процедуре набавке
	Процењена укупна сума	40.000.000 евра

	Вођа пројекта	ЈУП Истраживање и развој доо
Финансијски индикатори	Уговорено/Потрошено до 13. Јуна 2016. год.	Уговорено је или у статусу донетих одлука о прихватању понуда укупно € 29,321 мил док се за преговарачки поступак чека одобрење МПН за € 433.000. Укупно је плаћено из средстава ЕИБ € 28.522.358,36 Односно РСД 3.379.952.217,12
Јавне набавке		Набавка ситне опреме и потрошног материјала за 784 пројекта одабраних на јавном конкурс за циклус 2011-2015 Наручено до сада: ставки- око 140 000, комада-2.334.971 КОМ Уговорено и испоручено је за потребе реализације 75 000 ставки од укупно 150 000 Током последњек квартала 2015.г. покренута су 3 тендера: <u>Први тендер: ИОП/02-2015/Ц/6</u> - Процењена вредност набавке је 4.483.333,33 ЕУР (538.000.000 РСД) и обухвата 17.000 ставки у 72 лота. Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 2792 од 22.06.2015. године. Позив за подношење понуда је објављен у Службеном листу Европске уније (ОЈЕУ), на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 09.07.2015. године. Рок за подношење понуда : за Лот 01 – 036 је 24.08.2015. године, за Лот 037 – 072 је 25.08.2015. године. Записник о отварању понуда бр. 4940 је сачињен за Лот 01 – 036 дана 31.08.2015. године, а Записник о отварању понуда за Лот 037 – 072 бр. 5070 сачињен је 01.09.2015. године. На основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 7157 од 27.11.2015. године и Допуне извештаја бр. 7349 од 04.12.2015. године, донета је Одлука о додели уговора бр. 7508 од 10.12.2015. године. Број уговорених Лотова: 42. Укупан број ставки са прихватљивим понудама: 13.540. Укупна вредност додељених уговора: 2.482.692,67 ЕУР. Донета је Одлука о обустави поступка бр. 7509 од 10.12.2015. године којом су обустављени сви Лотови за које су понуде прекорачиле процењене

		вредности или нису достављене понуде. Одлучено је да се за 26 обустављених лотова покрене преговарачки поступак, док су 4 лота за које није било понуда ушла у тендер бр. ИОП/13-2015/Ц/9. <u>НПЛ/02-2015/Ц/6:</u> Позив за подношење понуда за преговарачки поступак за набавку потрошног материјала за понуде упућен је 28.12.2015. године. Рок за достављање понуда и отварање понуда одржало се 15.01.2016. године. На основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 5541 од 22.03.2016. године, донета је Одлука о додели уговора бр. 6780 од 13.04.2016. године. Број уговорених Лотова: 19. Укупна вредност додељених уговора: 1.180.584,85 ЕУР. Донета је Одлука о обустави поступка бр. 7158 од 13.04.2016. године којом су обустављени сви Лотови за које су понуде прекорачиле процењене вредности или нису достављене понуде. <u>Други тендер ИОП/04-2015/Ц/7:</u> Процењена вредност набавке је 2.150.000,70 ЕУР (258.000.000 РСД) и обухвата 6000 ставки у 132 лота. Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке. Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 3707 од 27.07.2015. године. Позив за подношење понуда је објављен у Службеном листу Европске уније (ОЈЕУ), на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 11.08.2015. године. Рок за подношење понуда : за Лот 100 – 165 је 28.09.2015. године, за Лот 166 – 232 је 29.09.2015. године. Записник о отварању понуда бр. 5831 је сачињен за Лот 100 – 165 дана 29.09.2015. године, а Записник о отварању понуда за Лот 166 – 232 бр. 5860 сачињен је 29.09.2015. године. Извештај о стручној оцени понуда бр. 7364 је потписан 07.12.2015. године, са Допуном извештаја бр. 7571 од 14.12.2015. године, на основу којих је донета Одлука о додели уговора бр. 7572 од 14.12.2015. године. Одлука о обустави поступка за поједине лотове, бр. 7573, донета је 12.12.2015. године. Одлука о измени одлуке о додели уговора за лот 164, 165, 195, 197 и 199 бр. 7937 донета је 28.12.2015. године, као и Одлука о измени одлуке о обустави за лот 164, 165, 197, 199 која је донета 28.12.2015. године. Потписивање
--	--	---

		уговора је било 28.12.2015. године. Банкарске гаранције за све уговорене лотове су достављене и уговори су ступили на снагу. Број уговорених Лотова: 62. Укупан број ставки са прихватљивим понудама: 2650. Укупна вредност додељених уговора: 733.668,42 ЕУР. <u>НПЛ/04-2015/Ц/7</u>: Преговарачки поступак је покренут за набавку НПЛ/04-2015/Ц/7 за преостале лотове. Позиви за подношење понуда су послати потенцијалним понуђачима 05.02.2016. године и отварање понуда се одржало 19.02.2016. године. На основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 7145 од 26.04.2016. године, донета је Одлука о додели уговора бр. 7462 од 12.05.2016. године. Број уговорених Лотова: 28. Укупна вредност додељених уговора: 550.797,59 ЕУР. Донета је Одлука о обустави поступка бр. 7462 од 12.05.2016. године којом су обустављени сви Лотови за које су понуде прекорачиле процењене вредности или нису достављене понуде. <u>Трећи тендер ИОП/05-2015/Ц/8</u>—Процењена вредност набавке је 541.666,67ЕУР (65.000.000 РСД) и обухвата 2500 ставки у 103 лота. Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке. Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 4665 од 21.08.2015. године. Позив за подношење понуда је објављен у Службеном листу Европске уније (ОЈЕУ), на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 06.10.2015. године. Рок за подношење понуда : за лотове 300 – 351, био је 18.11.2015. године, за лотове 352 – 402, био је 19.11.2015. године. Записник о отварању понуда бр. 7073 је сачињен за Лот 300 – 351 дана 20.11.2015. године, а Записник о отварању понуда за Лот 352 – 402 бр. 7074 сачињен је 20.11.2015. године. Извештај о стручној оцени понуда бр. 983 усвојен је дана 01.02.2016. године, на основу којих је донета Одлука о додели уговора бр. 2334 од 12.02.2016. године. Одлука о обустави поступка за поједине лотове, бр. 2334, донета је 12.02.2016. године. Уговори су ступили на снагу. Број уговорених Лотова: 49. Укупна вредност додељених уговора: 229.947,42ЕУР. <u>Четврти тендер ИОП/13-2015/Ц/9</u>, документација је послата ЕИБ на сагласност. Процењена вредност тендера: 225.832.256,40
--	--	---

		РСД односно 1.881.935,47 ЕУР. Број Лотова на тендеру: 287 Лотова. Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке. Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 7510 од 10.12.2015. године. Тендерска документација је послата 11.12.2015. године Банци на сагласност која је истог дана дала сагласност. Датум објаве Позива за подношење понуда у ОЈЕУ је 16.12.2015. године, док је датум објаве Позива на сајту наручиоца 18.12.2015. године. Рок за подношење понуда је био 14. и 15. март 2016. године. Извештај о стручној оцени поднуда бр.8946 од 23.06.2016. достављен је Банци на сагласност. Добијена је сагласност Банке на извештај о стручној оцени понуда. Одлуком о додели уговора 12901 од 28.10.2016. године уговори су додељени за 50 лотова у укупној вредности од 413.711.85 ЕУР. У току је потписивање уговора. За лотове за које није било понуда или су добијене понуде оцењене као неприхватљиве и неодговарајуће, донета је Одлука о обустави поступка 12902 од 28.10.2016. године. <u>Набавка стручне литературе</u> Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 6108 од 07.10.2015. године. <i>No objection</i> на Тендерску документацију смо добили од Банке 25.12.2015. године, а 14.12.2015. године је објављен Позив за подношење понуда. Рок за подношење понуда је био 07.03.2015. године. Одлука о додели уговора је донета 13.04.2016. године. Закључен уговор у вредности од 168.435,96 ЕУР. <u>Набавка електричних уређаја</u> Набавка електричних уређаја Процењена вредност набавке: 10.812.348,00 РСД. Број Лотова на тендеру: 4 Лота. Обухвата: 385 ставки. Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке. Ажурирање потреба научне заједнице за предметну набавку, се спроводило кроз анкету. Средства која су кајњи корисници претходних година определили кроз наруџбенице, имали су поново на располагању у анкети. Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 6219 од 12. октобра 2015. године. <i>No objection</i> на Тендерску документацију смо добили од Банке 25.12.2015. године, а дана 14.12.2015. године је објављен Позив за подношење понуда. Рок за достављање понуда: 27.01.2016. године. Отварање понуда
--	--	---

		је одржано 27.01.2016. године. Број поднетих понуда: 2. Одлука о доели уговора донета је 07.04.2016. године. Укупна уговорена вредност је 37.900,00 ЕУР. <u>Набавка тонера</u> - Процењена вредност набавке: 25.494.000,00 РСД. Број Лотова на тендеру: 2 Лота. Обухвата: 1747 ставки. Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке. Ажурирање потреба научне заједнице за предметну набавку, се спроводило кроз анкету. Средства која су претходних година определили кроз наруџбенице, имали су поново на располагању у анкети. Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка од 09.12.2015. године. Банка је доставила по objection на Тендерску документацију 11.12.2015. године. Датум објаве Позива за подношење понуда је 29.12.2015. године. Рок за подношење понуда: 24.02.2016. године. Отварање понуда је било 02.03.2016. године. Добијена је сагласност Банке на Извештај о стручној оцени понуда 11.04.2016. године. Закључен уговор за 1 Лот у вредности од 167.952,00 евра. <u>Набавка софтвера</u> - Процењена вредност набавке: 123.000.000,00 РСД. Број Лотова на тендеру: 200 Лотова. Обухвата: 542 ставке. Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке. Ажурирање потреба научне заједнице за предметну набавку, се спроводило кроз анкету. Крајњим корисницима смо послали упит, да ли остају при раније нарученом или не. Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка од 08.12.2015. године. Банка је доставила по objection на Тендерску документацију 11.12.2015. године. Рок за достављање понуда: 21. и 22. март 2016. године. Отварање понуда одржано 07. и 08.04.2016. године. Стручна оцена понуда је завршена и на Извештај је добијена сагласност Банке. Одлуком о додели уговора 13079 од 02.11.2016. године уговори су додељени за 8 лотова у укупној вредности од 22.250,00 ЕУР. У току је потписивање уговора. За лотове за које није било понуда или су добијене понуде оцењене као неприхватљиве и неодговарајуће, донета је Одлука о обустави поступка 13080 од 02.11.2016. године. <u>Набавка намештаја</u> – Процењена вредност набавке: 53.108.748,00 РСД. Број Лотова на тендеру: 3 Лота. Врста поступка:
--	--	---

		међународни отворени поступак јавне набавке. Ажурирање потреба научне заједнице за предметну набавку, се спроводило кроз анкету. Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка 6221 од 12.10.2015. године. Банка је доставила по objection на Тендерску документацију 25.11.2015.године. Датум објаве Позива за подношење понуда је 12.12.2015. године. Рок за достављање понуда: 25. јануар 2016. године. Отварање понуда одржано 25. Јануара 2016. године. Закључени су уговори за 3 Лота у вредности од 209.925,30 евра. <u>Набавка рачунара, рачунарске опреме и периферије, видео и фото опреме I, ИОП/1-2015/Ц</u> је покренута је априла 2015. године. Процењена вредност тендера била је 8.000.000,00 €. Уговори су потписани септембра 2015. године, а уговорена вредност је 5.519.322,00 €. Тендер је успешно реализован и испорука опреме је завршена. <u>Набавка рачунара, рачунарске опреме и периферије, видео и фото опреме II, ИОП/12-2015/Г</u> - Процењена вредност набавке: 177.211.080,00 РСД. Број Лотова на тендеру: 7 Лотова. Обухвата: 3813 ставки. Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке. Ажурирање потреба научне заједнице за предметну набавку, се спроводило кроз анкету. Средства која су претходних година определили кроз наруџбенице, имали су поново на располагању у анкети. Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка од 09.12.2015. године. Банка је доставила по objection на Тендерску документацију 11.12.2015. године, а дана 19.12.2015. године је објављен Позив за подношење понуда у ОЈЕУ. Крајњи рок за достављање понуда, наведен у Позиву објављеном на интернет страници наручиоца, као и датум отварања понуда је 18.02.2016. године. Извештај о стручној оцени понуда послат је Банци на по objection 08.04.2016. године и 11.04.2016. године добили смо по objection. Закључени су уговори за 7 Лотова у вредности од 1.453.189,30 евра. Тендер је успешно реализован и испорука опреме је завршена.
--	--	---

Пројекат бр 030	Назив потпројекта:	Изградња Центара изврсности Универзитета у Крагујевцу
-----------------	--------------------	---

	Категорија потпројекта:	ЕИБ - Оснивање Центара изврсности у областима истраживања са приоритетом на: - енергетски сектор и енергетска ефикасност, - заштита животне средине и климатске промене, - наука о материјалима и нанонаука, - пољопривреда и храна, - биомедицина - информационе и комуникационе технологије.
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ Град Крагујевац Универзитет у Крагујевцу
	Локација	Крагујевац
	Статус потпројекта:	Сprovedен међународни отворени поступак за избор Извођача радова. Потписан уговор са Извођачем радова Г.П. Банковић д.о.о. Црна Трава и Standard Invest group д.о.о. Београд 19.11.2015. године. Извођач је уведен у посао 23.12.2015. год. Рок за завршетак радова је 430 дана, односно 25.02.2017. године. Уговорена вредност радова је 7.877.859,27 евра без пдв а. У поступку ЈН изабран вршилац услуге координатор за БЗНР „Коперинг“ д.о.о.Нови Сад, вредност уговора 524.000,00 динара без пдв-а Надзор и Руководилац изградње -„ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд
	Планирани завршетак:	март 2017. године.
	Процењена вредност	14.576.000 евра
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	22. мај 2013. број: 401-00-400/2013-14
	Процењена вредност	10.000.000 евра - кредит ЕИБ и суфинансирање 40.000.000 динара - од града Крагујевца 25.500.000 динара - од Универзитета у Крагујевцу
	Стране уговора	Министарство образовања, науке и технолошког развоја; Град Крагујевац; Универзитет у Крагујевцу; ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд

Циљеви потпројекта	Циљ овог потпројекта је укључивање у образовни програм и регенеративну медицину усмерену на проучавање матичних ћелија и њихову употребу за лечење људи.
Студија изводљивости	Студија оправданости је припремљена 2011. од стране Медицинског факултета, на основу другог идејног пројекта који је био одбијен 2013. године. Због потпуно новог дизајна који је усвојен у 2014. год, потребно је припремити нову студију изводљивости, укључујући и пословни план. У фебруару 2015, Медицински факултет је обећао припрему таквог плана, у циљу подршке инвестиција
Опис потпројекта	Град Крагујевац је доделио локацију за изградњу Центара изврности Универзитета у Крагујевцу. Објекат се састоји од три блока међусобно повезана у једну целину. У левом блоку је наставни део, у средњем блоку истраживачке области-биомедицина, а у десном блоку предвиђени су простори за Банку матичних ћелија и Центар за истраживање матичних ћелија, као и још 4 истраживачка центра. У оквиру партерног уређења пројектован је простор за техничке објекте, паркинг и зелене површине са spolјним урбаним мобилијаром и простором за окупљање.
Радови	Радови су започети у децембру 2015. године (ради се на ископу и припреми темеља).
Примопредаја радова	Рок за завршетак радова је март 2017. године.
Надзор	Н/А
Уложено до марта 2016.	Уговорени радови и пратеће услуге € 8,132 мил Уложено из средстава ЕИБ € 132.034 РСД 15.645.000,11

Изградња Центара извржности - Универзитет у Крагујевцу



Пројекат бр 009	Назив потпројекта:	Изградња станова за младе истраживаче Универзитета у Крагујевцу
	Категорија потпројекта:	ЦЕБ2 - Компонента 3: Изградња станова за изнајмљивање младим истраживачима у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
	Извор финансирања:	ЦЕБ2 кредит
	Локација	Крагујевац
	Статус потпројекта:	Датум почетка радова је 19.05.2014. године. Рок за завршетак радова по Основном уговору је 12.08.2015. године, односно 450 календарских дана од Датума почетка радова. Закључени су Анекс I, Анекс II и Анекс III Уговора на основу којих је продужен рок за извођење радова закључно са 24.06.2016. године из оправданих разлога (временски услови, измене у условима комуналних кућа...) Радови су у завршној фази и очекује се завршетак истих до краја 2016. године. Остају радови на прикључењу објекта на спољну инфраструктуру као и отклањање недостатака и добијање употребне дозволе, а то је све условљено решењем о измени Инвеститора, односно преносу права коришћења земљишта са Града Крагујевца на Републику Србију, МПНТР и ангажовања Инвеститора на обезбеђењу инфраструктурних прикључака.
	Планирани завршетак:	август 2016.год.
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	13. јул 2012, број 451-02-3707/2012-01 (ЈУП бр. 2702 од 25. јуна 2012.)
	Процењена вредност	6.860.000 EUR
	Стране уговора	Република Србија - Министарство просвете и науке; Град Крагујевац; Универзитет у Крагујевцу; ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
Циљеви пројекта	Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди смештај младим истраживачима чиме се смањује број младих људи који одлазе у иностранство, односно смањује се одлив мозгова.	
Студија	Н/А	

ИЗВОДЉИВОСТИ	
Кратак опис пројекта	Укупна планирана нето површина станова је 9800 м2, а број станова је 210. Структура станова је следећа: 100 једнособних станова површине 35м2, 70 једноипособних станова површине 50м2 и 40 трособних станова површине 70м2. Максимална могућа развијена бруто површине објекта износи 15.000 м². Предвиђено је и 210 паркинг места на оствореном и подземној гаражи (168 места у подземној гаражи, а остало на 42 места на отвореном). Површина подземне гараже је 11 500 м2, а отвореног паркинг простора 6 300 м2.
Набавка и уговарање	Након националног отвореног поступка (модел уговора FIDIC Plant and Design and Build) потписан је Уговор са Извођачем радова Г.П. Банковић д.о.о. Црна Трава, Standard Invest group д.о.о. Београд, Елкомс д.о.о. Београд и Архи Форм д.о.о. Београд Нето Уговор цена (без ПДВ-а) је ЕУР 5,491,832.00 еура или 6,590,198.40 (са ПДВ-ом). Авансно плаћање је 20% од уговорене цене.
Извођачи радова:	Конзорцијум: Г.П. Банковић д.о.о. Црна Трава Standard Invest group д.о.о. Београд Архи Форм д.о.о. Београд Елкомс д.о.о. Београд
Надзор:	Инжењеринг плус Пројект Београд (на основу спроведене ЈН потписан је уговор у износу од 7.770.000 динара без пдв-а)
Планирана примопредаја радова	крај 2016. године.
Уложено до сада.	Из средстава ЦЕБ 2 € 4.266.463,03 РСД 514.569.762,39

Изградња станова за младе истраживаче у Крагујевцу



Пројекат:	Назив потпројекта:	Изградња Научно-технолошког парка, фаза 2, Нови Сад
	Категорија потпројекта:	ЕИБ - Изградња науке и технолошких паркова у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ
	Локација	Нови Сад
	Статус потпројекта:	Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду је израдио пројектно техничку документацију и технички део тендерске документације за спровођење поступка ЈН за извођење радова на изградњи објекта, НТПНС. На основу исте добијено је Решење о грађевинској дозволи. Формирна је радна група коју чине представници ФТНУНС и ЈУП-а за реализацију потпројекта. Спроведен је отворени међународни поступак ЈН за избор Извођача радова. Након избора најповољнијег Извођача радова исти је одустао од уговора и уговор је након сагласности банке додељен следећем најповољнијем понуђачу. Извођач радова је група понуђача „Italiana Costruzioni“S.p.a. и „Амига“ д.о.о. Краљево. За услугу Координатор за БЗНР за израду пројекта и за обављање послова координатора за извођење радова у поступку ЈН изабрано предузеће „Коперинг“ д.о.о. Нови Сад.
	Планиран завршетак:	730 дана, август 2018.
	Процењена вредност	20.000.000 евра (процењена вредност је већа од 13,5 милиона евра које је одобрило МПНТП)
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	13. септембар 2010. (451-03333/2010 Покрајински администрација): Уговор о условима финансирања и начину реализације пројекта изградње Технолошког парка у Новом Саду бр 660-01-100/2014-14 од 29.12.2014 године (заведено у МПНТР) /Споразум о реализацији извођења радова и вршења стручног надзора над изградњом објекта НТПНС фаза II од 9.03.2016. и Анекс I Споразума о реализацији извођења

		радова и вршења стручног надзора над изградњом објекта НТПНС фаза II од 19.05.2016. године
	Процењена вредност	УКУПНО: 13.500.000 евра за Фазу 2 до сада одобрено 9.606.728 евра за фазу 2 - ЕИБ кредит, и 3.685.662,46 евра - Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
	Стране уговора	Уговор о условима финансирања и начину реализације пројекта изградње Технолошког парка у Новом Саду бр 660-01-100/2014-14 од 29.12.2014 године (заведено у МПНТР): Република Србија- Министарство просвете, науке и технолошког развоја Аутономна Покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој; Универзитет у Новом Саду; Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука; ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да пружи инфраструктурну подршку новооснованим компанијама базираним на иновацијама које проистичу из научних истраживања и директних инвестиција високо-технолошких компанија у истраживање и развој. Значајна пословна подршка има за циљ да послужи малим инкубатор предузећима која ће моћи да користе услуге парка по повољним условима током прве три године од њиховог оснивања.	
Студије изводљивости/одрживости	Нацрт Студија изводљивости / одрживости је припремљен 2014. на Факултету техничких наука. Студија је процењена од стране ТА која је доставила коментаре ЈУП и кориснику. Технички извештаји неопходни за процедуре набавке су спремни.	
Кратак опис пројекта	Предметна парцела за пројектовање Технолошког парка налази се у оквиру Универзитетског кампуса, на углу улица Др Илије Ђуричића и Фрушкогорске, на парцели 3090 (КО Нови Сад ИИ). На основу Плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду 1761, и урбанистичких услова бр.	

	93043/2010, на парцели је предвиђен објекат Факултета техничких наука, спратности Су+П+4 до Су+П+6 , и степен заузетости површине до 100% на нивоу приземља, односно 70% за етаже изнад галерије. Спратност објекта, према захтевима из овог Плана, опада од више ка нижој према северу и истоку парцеле, односно, према раскрсници Фрушкогорске улице и Булевара Цара Лазара и студентским домовима. Паркирање је предвиђено дуж улице Др Илије Ђуричића и у подземној етажи, којој се приступа из колске улице постављене дуж североисточне стране објекта, формирањем два улаза и излаза. Грађевинска и регулациона линија се поклапају, и постављене су дуж граница парцеле. У складу са Планом и Условима, пројектована је пешачка комуникација кроз објекат, којом се спаја раскрсница Фрушкогорске улице и Булевара Цара Лазара са улицом Др Симе Милошевића. У односу на предвиђене организационе целине Научно-технолошког парка, дефинисане су следеће просторне целине објекта: а) улазни блок б) амфитеатар и сале за предавања са пратећим простором ц) лабораторије за тешку опрему д) лабораторије за рачунарску и лакшу електричну опрему е) канцеларије запослених на Факултету ф) блок управе Научно-технолошког парка г) пословни блок (флексибилни канцеларијски простор, архиве, фотокопир собе, чајне кухиње...) х) блок „Инкубатора“ и) блок јавних и комерцијалних простора (кафетерија, изложбени простор, кантина...) ј) комуникације (студената, запослених у пословном парку, посетилаца, запослених на Факултету, колске, економске....) к) блок енергетских и осталих инжењерско-техничких простора (трафостаница, подстанница грејања, клима подстанница, дизел агрегат...) л) подземна гаража са припадајућим садржајима; м) двонаменско склониште Распоред садржаја према етажама усклађен је са фреквенцијом коришћења одређених садржаја. Организација објекта изведена
--	---

	је из услова локације, функционално-технолошких захтева, карактера унутрашњег простора, као и карактера архитектонског израза читавог објекта.
Набавка и уговарање	Отворени међународни поступак ЈН за избор Извођача радова -Извођач радова је група понуђача „Italiana Costruzioni“S.p.a. и „Амига“ д.о.о. Уговорена цена 12.594.366,61 евра без пдв- Отворени поступак ЈН за услугу израде Плана превентивних мера и услугу координатора за пројектовање и координатора за извођење радова. Изабрани понуђач-„Коперинг“ д.о.о. Нови Сад. Уговорени износ услуге 524.000 динара без пдв-а
Извођачи радова:	група понуђача „Italiana Costruzioni“S.p.a.и „Амига“ д.о.о. Краљево.
Надзор:	ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
Планирана примопредаја радова	Август 2018.
Уложено до сада	Из средстава ЦЕБ 2 3.863.966,20 ЕУР РСД 464.908.768,81

Научно-технолошки парк у Новом Саду, фаза 2





ТАБЕЛА ПОТПРОЈЕКТА У ПРИПРЕМИ

Пројекат бр. 014	Назив потпројекта:	Пројекат за изградњу станова за младе истраживаче у Нишу
	Категорија потпројекта:	ЦЕБ2 - Компонента 3: Изградња станова за изнајмљивање младим истраживачима у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
	Извор финансирања:	ЦЕБ2 кредит
	Локација	Ниш
	Статус потпројекта:	Пројекат је привремено обустављен. Студија за процену постојећих услова је завршена.
	Планирани завршетак:	-
	Процењена вредност	3.500.000 евра
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	-
	Процењена вредност	-
	Стране уговора	-
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди смештај за младе истраживаче чиме се смањује број људи који одлазе из земље, односно смањује се одлив мозгова.	
Студије изводљивости/одрживости	Н/А	

Изградња станова за младе истраживаче у Нишу



Пројекат бр. 013	Назив потпројекта:	Изградња Научно-технолошки парк у Нишу
	Категорија потпројекта:	ЦЕБ2 - Компонента 2, изградња Научно-технолошког парка у Нишу
	Извор финансирања:	ЦЕБ2 кредит ЕУР 10 милиона
	Локација	Ниш
	Статус потпројекта:	У припреми. Главни пројекат је завршен, недостаје техничка контрола.
	Планиран завршетак:	Децембар 2015.
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	08. март 2011. (398 ПИУ, 011-00-26/2011-01/3 Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
	Процењена вредност	12.000.000 евра
	Стране уговора	Министарство образовања, науке и технолошког развоја ЈУП Истраживање и развој доо
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да пружи инфраструктурну подршку новооснованим компанијама базираним на иновацијама које проистичу из научних истраживања и директних инвестиција високо технолошких компанија у истраживање и развој. Значајна пословна подршка има за циљ да послужи малим инкубатор предузећима која ће моћи да користе услуге парка по повољним условима током прве три године од њиховог оснивања.	
Студије изводљивости/одрживости	Захтевати израду	

Научно-технолошки центар у Нишу



Пројекат бр.012	Назив потпројекта:	Адаптација УНЕСЦО ИРТЦУД истраживачког центра , Београд
	Категорија потпројекта:	ЕИБ - Адаптација постојећих зграда и лабораторија
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ
	Локација	Београд
	Статус потпројекта:	Још увек није почела
	Планирани завршетак:	Април 2014.
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	9. март 2011. (370 ПИУ, 400-00-39/2011-01 Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
	Процењена вредност	27.162.711,97 динара
	Стране уговора	Министарство образовања, науке и технолошког развоја; Грађевински факултет у Београду; ЈУП Истраживање и развој доо
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди адекватан простор за несметан рад УНЕСЦО ИРТЦУД истраживачког центра који се налази у подруму Грађевинског факултета у Београду.	
Студије изводљивости/одрживости	Н/А	

Адаптација УНЕСКО ИРТЦУД истраживачког центра, Београд



Пројекат бр. 019	Назив потпројекта:	Изградња Центра за биомедицинска истраживања, Београд
	Категорија потпројекта:	ЦЕБ2 - Компонента 1: Успостављање Центра изврности у областима истраживања где је приоритет: - Изградња Центра за биомедицинска истраживања у Београду - Изградња и опремање Агробилошког и технолошког центра, Нови Сад - Изградња Центра за нанонауку и нове материјале у Београду
	Извор финансирања:	ЦЕБ2 кредит
	Локација	Београд
	Статус потпројекта:	Још увек није почео
	Планирани завршетак:	-
	Процењена вредност	13.000.000 евра
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	-
	Процењена вредност	-
	Стране уговора	-
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да побољша услове рада у области медицинских истраживања и да повеже основна истраживања са развојном и примењеном биомедицинском праксом. Промоција образовања и обуке истраживача и студената, допринос развојном капацитету преко ангажовања више младих истраживача.	
Студије изводљивости/одрживости	Захтевати израду	

Пројекат бр. 027	Назив потпројекта:	Набавка опреме за Наноцентар, блок 39, Београд
	Категорија потпројекта:	ЦЕБ2 - Компонента 1: Формирање центара изврсности за истраживања где је приоритет: - изградња центра за Биомедицинска истраживања у Београду - изградња и опремање Агробилошког и технолошког центра у Новом Саду - изградња Центра за нанонауку и нове материјале у Београду
	Извор финансирања:	ЕИБ (50%) и ЦЕБ2 (50%)
	Локација	Београд
	Статус потпројекта:	У припреми
	Планирани завршетак:	-
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	8. март 2011. (396 ПИУ, 011-00-26/2011-01/1 Министарство образовања, науке и технолошког развоја)
	Процењена вредност	20.000.000 евра - опрема; 20.000.000 евра - изградња, види ПР002
	Стране уговора	Министарство просвете, науке и технолошког развоја ЈУП Истраживање и развој доо
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да побољша истраживања у области нанонауке, нових материјала, микро израде, промоцију докторских и пост-докторских истраживања са савременом инфраструктуром у лабораторијама, што је у складу са стандардима Европских области истраживања (ЕРА), са стратешким циљем да допринесе Европском стратешком форуму у погледу истраживачке инфраструктуре (ЕСФРИ).	

Пројекат бр. 020	Назив потпројекта:	Изградња Агробилошког и технолошког центра, Нови Сад
	Категорија потпројекта:	ЦЕБ2 - Компонента 1: Формирање Центара изврности у областима истраживања где је приоритет: - Изградња Центра за биомедицинска истраживања у Београду - Изградња и опремање Агробилошког и технолошког центра, Нови Сад - Изградња Центра за нанонауку и нове материјале у Београду
	Извор финансирања:	ЦЕБ2 кредит
	Локација	Нови Сад
	Статус Потпројекат:	Још увек није почео
	Планиран завршетак:	-
	Процењена вредност	ЕУР 7.000.000
Уговор са Министарством образовања, науке и технолошког развоја	Датум и број	-
	Процењена вредност	-
	Стране уговора	-
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да промовише коришћење потенцијала постојећих био-технолошких институција, како би се омогућило активније учешће у европским истраживачким пројектима, модернизација опреме и улагања у људске ресурсе у циљу да допринесе националном и регионалном развоју у овој научној области.	
Студије изводљивости/одрживости	Захтевати израду	

Пројекат:	Назив потпројекта:	Пројекат за изградњу станова за младе истраживаче, блок 32, Београд, фазе 2 и 3
	Категорија потпројекта:	ЦЕБ2 Компонента 3 - Нове стамбене зграде за младе истраживаче у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу
	Извор финансирања:	ЦЕБ2 кредит
	Локација	Београд
	Статус Потпројекат:	У припреми
	Планиран завршетак:	-
Уговор са Министарством за образовање, науку и технолошки развој	Датум и број	
	Процењена вредност	фаза 2: ЕУР 6.665.000 и фаза 3: ЕУР 8,335,000
	Стране уговора	
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је дизајниран да обезбеди смештај за младе истраживаче, чиме се смањује број младих људи који напуштају земље, односно смањење одлива мозгова.	
Студије изводљивости/одрживости	Н/А	

Изградња станова за младе истраживаче, блок 32, Београд, фазе 2 и 3



ТАБЕЛА ПОТПРОЈЕКТА КОЈИ ТРЕБА ДА ПОЧНУ

Пројекат бр.028	Назив потпројекта:	Изградња Института за ветеринарске науке, Нови Сад
	Категорија потпројекта:	ЦЕБ2 - Компонента 1: Оснивање центара изврсности у областима истраживања где је приоритет: - Изградња центра за биомедицинска истраживања у Београду - Изградња и опремање Агробилошког и технолошког центра, Нови Сад - Изградња Центра за нанонауку и нове материјале у Београду
	Извор финансирања:	ЦЕБ2 кредит
	Локација	Нови Сад
	Статус потпројекта:	Идејно решење је завршено, израда главног пројекта још није почела.
	Планирани завршетак:	-
	Процењена вредност	7.000.000 евра
Уговор са Министарством образовања, науке и технолошког развоја	Датум и број	-
	Процењена вредност	-
	Стране уговора	-
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да промовише коришћење потенцијала постојећих институција био-технолошких наука у циљу омогућавања активнијег учешћа у европским истраживачким пројектима, модернизације опреме и улагања у људске ресурсе у циљу доприноса националном и регионалном развоју у овој научној области.	
Студије изводљивости/одрживости	Н/А	

Пројекат бр. 018	Назив потпројекта:	Набавка опреме за Суперкомпјутер иницијативе
	Потпројекат Категорија:	ЕИБ - Модернизација академске рачунарске мреже и инфраструктуре за Суперкомпјутер иницијативе
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ
	Локација	Београд
	Статус потпројекта:	Још увек није почео
	Планиран завршетак:	-
	Процењена вредност	10.000.000 евра
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	-
	Процењена вредност	-
	Стране уговора	-
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен са циљем интегрисања у регионалну и европску мрежну инфраструктуру, унапређење људског капитала кроз обуку и друге врсте образовања, повећање конкурентности истраживачке заједнице Србије, модернизацију опреме.	
Студије изводљивости/одрживости	Н/А	

Пројекат бр. 021	Назив потпројекта:	Пројекат за изградњу станова за младе истраживаче у Новом Саду
	Потпројекат Категорија:	ЦЕБ 2 - Компонента 3: Изградња станова за изнајмљивање младим истраживачима у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
	Извор финансирања:	ЦЕБ 2 кредит
	Локација	Нови Сад
	Статус потпројекта:	Још увек није почео
	Планирани завршетак:	-
	Процењена вредност	2.975.000 евра
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	-
	Процењена вредност	-
	Стране уговора	-
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди смештај младим истраживачима чиме се смањује број младих који напуштају земљу, односно смањење одлива мозгова.	
Студије изводљивости/одрживости	Н/А	

Пројекат бр. 026	Назив потпројекта:	Изградња објекта института, блок 39, Београд
	Потпројекат Категорија:	ЦЕБ2 - Компонента 1: Оснивање Центара изврсности у областима истраживања где је приоритет: - Изградња центра за биомедицинска истраживања у Београду - Изградња и опремање Агробиолошког и технолошког центра у Новом Саду - Изградња Центра за нанонауку и нове материјале у Београду
	Извор финансирања:	ЦЕБ2 кредит
	Локација	Београд
	Статус потпројекта:	Још увек није почео
	Планирани завршетак:	-
	Процењена вредност	10.000.000 евра
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	-
	Процењена вредност	-
	Стране уговора	-
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен како би се комбиновали потенцијали постојећих научних институција ради активнијег учешћа у европским научним пројектима, модернизације опреме и улагања у људске ресурсе, и доприноса националном и регионалном развоју науке.	
Студије изводљивости/одрживости	Захтевати израду	

ТАБЕЛА ПОТПРОЈЕКТА КОЈИ СУ ТРЕНУТНО СУСПЕНДОВАНИ

Пројекат:	Назив потпројекта:	Адаптација објекта у улици Светозара Марковића 21, Београд
	Потпројекат Категорија:	ЕИБ - Инфраструктура за Министарство за образовање, науку и технолошки развој
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ
	Локација	Београд
	Статус Потпројекат:	Овај потпројекат је привремено суспендован због правних питања (власништво зграде припада Министарству одбране)
	Планирани завршетак:	-
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	Датум и број	-
	Процењена вредност	-
	Стране уговора	-
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен да уједини инфраструктуру и радни простор некадашњег Министарства науке.	
Студије изводљивости/одрживости	Н/А	

Пројекат:	Назив потпројекта:	Кампус Математичке гимназије
	Потпројекат Категорија:	ЕИБ – Истрживачка станица Петница и кампус Математичке гимназије
	Извор финансирања:	Кредит ЕИБ
	Локација	Београд
	Статус потпројекта:	Још увек није почео
	Планирани завршетак:	-
Уговор са Министарством образовања, науке и технолошког развоја	Датум и број	-
	Процењена вредност	1.000.000 евра
	Стране уговора	-
Циљеви потпројекта	Овај потпројекат је осмишљен са циљем изградње кампуса Математичке гимназије.	
Студије изводљивости/одрживости	Н/А	

Прилог

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОДПРОЈЕКТА ИЗ ПРОЈЕКТА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 31.10.2016.

I ПОДПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ УГОВОРЕНИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗАВРШЕНИ ИЛИ ТРЕНУТНО АКТИВНИ

u EUR

Број	Пројекат	Уговорено са Министарством			*Укупно пројекција трошкова на реализацији подпројекта	Финансијска реализација по пројектима			ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	СТАТУС ПРОЈЕКТА
		Изградња	опремање	укупно		Потписане уговорене обавезе/ фактурисано /	Измирене обавезе	Нефактурисане и недоспеле уговорене обавезе по завршеним Јавним набавкама		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
1	Центар за промоцију науке, Блок 39, Београд	40.000.000	25.000.000	65.000.000	65.000.000	3.655.544	3.262.399	393.145	ЕИБ,	завршено пројектовање, у току контрола пројекта
2	Централна зграда Универзитета у Новом Саду	4.000.000		4.000.000	4.100.322	4.100.322	4.100.322	0	ЕИБ 4 мил ЕУР + суфинансирање РСД Фонд за капитална улагања АП	завршен објекат
3	Научно-технолошки парк Звездара, Београд	17.317.000		17.317.000	14.407.656	14.407.656	14.407.656	0	ЕИБ	завршен објекат, предат МПН односно НТР Београд д.о.о.
4	Природњачки центар Свилајнац	4.775.689	1.500.000	6.275.689	6.267.488	6.262.237	6.262.237	0	ЕИБ	завршен пројекат, у употреби,
5	Научно-технолошки парк, фаза I, Нови Сад	1.398.131		1.398.131	1.393.726	1.393.725	1.393.725	0	ЕИБ,	завршен објекат, у употреби
6	Станови за младе истраживаче Блок 32, Београд, Фаза I	10.000.000		10.000.000	8.608.121	8.493.744	8.483.620	10.124	ЦЕБ 1711/ЕИБ	Завршен објекат, у употреби,
7	Истраживачка станица Петница, Ваљево	6.000.000	3.040.064	9.040.064	8.724.245	8.727.501	8.727.501	0	ЕИБ	објекат завршен, у употреби,
8	Набавка капиталне опреме за истраживање		50.000.000	50.000.000	50.000.000	35.342.410	30.163.834	5.178.576	50% ЕИБ и 50% ЦЕБ1711	У претходном извештају приказани износ уговорено обухватао и процене вредности ЈН у току, док су овим Извештајем обухваћени потписани уговори из тих ЈН. Очекује се став МПН у погледу покретања нових ЈН у вредности од ЕУР 4,67 милиона за неуспеле тендере.
9	Наноцентар, Блок 39, Београд	20.000.000		20.000.000	20.000.000	1.447.684	1.412.956	34.728	ЦЕБ 1739/ЕИБ	завршено пројектовање , пројекат на оцени код Рвизионе комисије, завршени и припремни земљани радови
10	Опрема за Наноцентар, Блок 39, Београд		20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	ЦЕБ 1739/ЕИБ	
11	Санација темеља- Хемијски факултет Универзитета у Београду	800.000		800.000	731.251	731.251	731.251	1	ЕИБ	завршено. Коначни обрачун са извођачем извршен само од стране ЈУП-а.
12	Систем за централизовану набавку потрошног материјала		40.000.000	40.000.000	40.000.000	29.754.286	28.522.358	1.231.928	ЕИБ	У претходном извештају приказани износ уговорено обухватао и процене вредности ЈН у току, док су овим Извештајем обухваћени потписани уговори из тих ЈН као и ЈН из могућег преговарачког поступка од ЕУР 433.000 за неуспеле лотове.
13	Центри извршености Универзитета у Крагујевцу	10.000.000	4.000.000	14.000.000	14.576.000	8.132.188	132.034	8.000.154	Из средстава ЕИБ (ЕУР 14 милиона) плус улагање града Крагујевца РСД 40 милиона и Универзитета у Крагујевцу РСД 25,5 милиона; укупно РСД 65.500.000,00	Завршено пројектовање, у току изградња објекта
14	Станови за младе истраживаче, Крагујевац	6.860.000		6.860.000	6.860.000	5.564.492	4.266.463	1.298.029	ЦЕБ 1739	изводе се радови на објекту
15	Научно-технолошки парк, фаза II, Нови Сад	9.606.728		9.606.728	20.000.000	12.976.733	0	12.976.733	ЕИБ, Универзитет у Новом Саду ЕУР 4 милиона, осталофинансирање ће се обезбедити кроз партнере будуће закупе	Пројекат урадио Универзитет у НС , са изабраним извођачем потписан уговор,
16	Финансијска и техничка помоћ ПИУ		3.000.000	3.000.000	3.000.000				ЦЕБ 1739	
УКУПНО		130.757.548	146.540.064	277.297.612	283.668.809	140.989.774	111.866.356	29.123.418		

II ПОДПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ УГОВОРЕНИ СА МИНИСТАРСТВОМ И КОЈИ СУ У ПРИПРЕМИ										
u EUR										
Број	Пројекат	Уговорено са Министарством			Укупно пројекција трошкова на реализацији подпројеката	Реализација по пројектима			ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	СТАТУС ПРОЈЕКТА
		Изградња	опремање	укупно		Потписане уговорене обавезе/ фактурисано /	Измирене обавезе	Нефактурисане и недоспеле уговорене обавезе/ обавезе по завршеним Јавним набавкама		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
1	Научно-технолошки парк НИШ	12.000.000		12.000.000	12.000.000			0	ЦЕБ 1739 EUR 10 mil.	израђен пројекат, потребно препројектовање, проблеми са локацијским условима
2	Адаптација простора UNESCO Истраживачког центра IRTCUD, Београд	311.180		311.180	350.000	3	3	0	ЕИБ	Постоји пројекат, Инвеститор није обезбедио грађевинску дозволу
3	Станови за младе истраживаче, Блок 32, Београд, Фаза 2	6.665.000		6.665.000	6.665.000			0	ЦЕБ 1739	израђен пројекат, потребно препројектовање и решење питања грађевинског земљишта између Фондације и Дирекције
4	Станови за младе истраживаче, Блок 32, Београд, Фаза 2	8.335.000		8.335.000	8.335.000					израђен пројекат, потребно препројектовање и решење питања грађевинског земљишта између Фондације и Дирекције
	УКУПНО	27.311.180		27.311.180	27.350.000	3	3	0		

III ПОДПРОЈЕКТИ КОЈИ НИСУ УГОВОРЕНИ СА МИНИСТАРСТВОМ А ПРЕДВИЂЕНИ СУ ПРОЈЕКТОМ ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ										
Број	Пројекат	Уговорено са Министарством			Укупно пројекција трошкова на реализацији под пројеката	Реализација по пројектима			ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	СТАТУС ПРОЈЕКТА
		Изградња	опремање	укупно		Потписане уговорене обавезе/ фактурисано / обавезе по завршеним Јавним набавкама	Измирене обавезе	Нефактурисане и недоспеле уговорене обавезе/ обавезе по завршеним Јавним набавкама		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
1	Суперрачунарска иницијатива				10.000.000				ЕИБ	
2	Станови за младе истраживаче, Ниш				4.000.000				ЦЕБ 1739, Фондација за решавање притања становања младих научних радника у Нишу	завршени груби грађевински радови
3	Центри изврности - Биомедицински истраживачки центар, Београд				13.000.000	294	294		ЦЕБ 1739	
4	Центри изврности - Пољопривредно биотехнолошки центар, Нови Сад				7.000.000				ЦЕБ 1739	
5	Центар изврности - Институт за ветеринарске науке, Нови Сад				7.000.000				ЦЕБ 1739	
6	Станови за младе истраживаче, Нови Сад				2.975.000				ЦЕБ 1739	
7	Адаптација и санација зграде у Светозара Марковића 21, Београд				1.000.000				ЕИБ	
8	Кампус Математичке гимназије				1.000.000				ЕИБ	
9	Зграда института, Блок 39, Београд				10.000.000				ЕИБ 1 ЦЕБ 1739	
	УКУПНО				55.975.000	294	294	0		

Напомена: У табелама је обухваћена финансијска реализација искључиво по уговорима које је ради реализације пројеката потписао са понуђачима „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд и који су финансирани средствима кредита и зајмова ЕИБ-а и ЦЕБ-а и другим примљеним новчаним средствима Републике Србије или надлежних институција. Вредност земљишта, претходна улагања, плаћени порези и трошкови управљања нису обухваћени табелом и биће исказани тек по кончаном обрачуну вредности пројекта
