

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 346/2
19.01. 2018 ГОД.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

„Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о Београд
Немањина 22-26
БЕОГРАД

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

„ЈЕДИНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ
СЕКТОРУ“ Д.О.О. БЕОГРАД

ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

Београд, јануар 2018.

САДРЖАЈ:

1. Општи подаци о привредном друштву.....	3
2. Резиме реализације за период 2010-2017. године и план реализације за 2018. годину.....	8
3. План реализације потпројеката оквирног Пројекта истраживање и развој у јавном сектору за 2018. годину и оквирни план за 2019. годину.....	10
4. План реализације Програма модернизације школа за 2018. и 2019. годину.....	14
5. План реализације Програма „Национални део Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“ за 2018. и оквирни план 2019. и 2020. годину.....	18
6. Финансијски план оперативних прихода и расхода ЈУП-а за 2018. годину.....	25
7. Закључак.....	30
8. Прилози.....	33

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ

Привредно Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд, скраћено пословно име „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, основано је Одлуком Владе Републике Србије број 05 број: 02-5424/2010 од 22. јула 2010. године за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 51/10, 72/2013, 24/14 и 65/14) под именом „ЈУП истраживање и развој“ д.о.о. Београд (скраћени назив).

Седиште Друштва регистровано је на адреси Немањина 22-26, Београд, општина Савски Венац. Службене просторије Друштва налазе се на адреси Вељка Дугошевића 54, Београд (зграда Научно-технолошког парка „Београд“), које се користе на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 021-7081/2013-1 од 25. августа 2013. године и Закључка 05 Број 022-3124/2015 од 26. марта 2015. године.

ПИБ додељен од стране Пореске управе је 106729004.

Матични број Друштва је 20668890.

Средства којим послује Друштво су у јавној својини.

Друштво је основано и послује у складу са Законом о привредним друштвима. Време на које је Друштво основано првобитно је било одређено до завршетка спровођења Пројекта истраживање и развој у јавном сектору.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживања и развој у јавном сектору 05 Број: 02-6948/2013 од 09. августа 2013. године („Службени гласник РС“ бр. 72/13) предвиђено је да Друштво обавља и послове пружања услуга консалтинга и менаџмента у вези са спровођењем националног дела Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице (РХП). Овом Одлуком предвиђено је да ако до завршетка послова спровођења Пројекта истраживање и развој у јавном сектору не буду окончани послови спровођења националног дела Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице, Друштво престаје завршетком послова спровођења тог програма (РХП).

Уговором број: 401-00-115/2014-01 од 03.02.2014. године Друштву је додељен на управљање и „Програм модернизације школа“ у Републици Србији који се финансира из средстава кредита Европске инвестиционе банке (ЕИБ).

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године којим се даља реализација Пројекта истраживање и развој у јавном сектору поверава Канцеларији за управљање јавним улагањима, с тим да се Закључком (члан 3.) „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд задужује да преузете обавезе по свим закљученим уговорима са другим правним лицима, везаним за реализацију Пројекта истраживање и развој у јавном сектору, реализује по уговореним роковима и након реализације сву проистеклу документацију преда Канцеларији за управљање јавним улагањима.

Влада Републике Србије је 30. децембра 2016. године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору (05 Број: 02-02-12814/2016) којим се **врши промена пословног имена Друштва у Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд**. Трајање Друштва је дефинисано да обавља своју делатност на неодређено време, док се опис делатности Друштва у члану 8. Одлуке о оснивању Друштва (пречишћен текст) проширује, додаје нови став да Друштво обавља послове пружање услуга консалтинга, менаџмента и стучног надзора, као и свих других услуга у вези са управљањем пројектима у јавном сектору, који су му поверени међународним уговором, законом, актом оснивача или уговором којим се уређује начин реализације сваког пројекта, права и обавезе уговорних страна у реализацији, финансирање пројеката, рокови за реализацију, начин извештавања, јавне набавке које је потребно спровести и начин њихове реализације и други потребни елементи.

Друштво, у складу са оснивачким актом, заступа директор, без ограничења овлашћења. Директора именује и разрешава Оснивач, Влада РС, на предлог министра надлежног за научноистраживачку делатност. Директор се именује на период од пет година и може бити поново именован.

У периоду од августа 2010. године до фебруара 2013. године, у својству директора, Друштво је заступао др Дарко Ђукић (ЈМБГ 1211974381529). Од 1. марта 2013. године до 23. јануара 2015. године Друштво је заступао проф. др Александар Симоновић (ЈМБГ 1209975710394) до 23. Јануара 2015. године, од 23. јануара 2015. до 04. Маја 2017.године друштво је заступао др Горан Квргић ЈМБГ 2106973710214., од 05. маја до 22. августа 2017. године друштво је заступала Весна Вандић (ЈМБГ 2610956757916) као вршилац дужности директора друштва док је Одлуком Владе РС Број: 119-7940/2017 од 22. августа 2017. године именован Драган Катуча (ЈМБГ 2910978860021) за вршиоца дужности директора Друштва.

Овлашћења Скупштине Друштва врши Оснивач, Влада РС преко овлашћених представника. Одлуку о одређивању и разрешењу председника и чланова Скупштине доноси Оснивач, а по одлуци оснивача у 2017. години функцију председника Скупштине врши Наталија Дугоњић, док су чланови др Петар Шкундрић, др Едита Кастратовић, Александар Марковић, Светлана Станојевић-Петровић, др Мирјана Филиповић и Владимир Пелевић.

У складу са чланом 6 Закона о рачуноводству, друштво је разврстано у средње правно лице и обвезник је ревизије финансијских извештаја за 2017. годину.

Друштво послује преко текућих рачуна отворених код следећих банака:

Sberbank Srbija a.d. Beograd:

- *динарске*

285 - 1001000000218 - 44

285 - 1001000000217 - 47

285 - 1001000000216 - 50

285 - 1001000000314 - 47

- *девизне*

285 - 1001209891193 - 97

285 - 1001209891192 - 03

Комерцијална банка а.д. Београд:

- *динарски*

205 - 160097 - 44

- *девизни*

205 - 701 003948-53

Societe Generale Srbija a.d. Beograd

- *динарски*

275-10221630812-70

- *девизни*

275-10221630827-25

Raiffeisen banka a.d. Beograd

- *динарски*

265-1040310002112-27

- *девизни*

265-100000011370585

Банка Интеса а.д. Београд

- *динарски*

160-490457-98

Трезорски рачуни

840-858723-09

840-407723-32

Укупан уписани новчани основни капитал Друштва је 500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. Уплаћени капитал друштва је 250 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС.


Претежна делатност Друштва су консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем (шифра делатности - 7022).

Друштво нема формиран ценовник услуга, из разлога што у досадашњем пословању Друштва није постојала обавеза, а ни потреба да привредно друштво доноси политику цена с обзиром да је вредност услуга утврђивана директним преговорима са послодавцима у зависности од сложености пројекта и расположивим средствима и креће се у % од 1,5-3% од вредности уговора, зависно од врсте уговора и обима посла на конкретном пројекту.

Организациона структура ЈУП-а за 2017. годину утврђена је Правилником о организацији и систематизацији радних места у „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о Београд број 1568 од 24.04.2015. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у “ЈУП Истраживање развој” д.о.о. Београд број 5068 од 01.09.2015. године и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у “ЈУП Истраживање развој” д.о.о. Београд број 6830 од 12.11.2015. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд број 1568 донет 16.05.2016. и Правилником о организацији и систематизацији послова – радних места у „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд број 14952 од 30.12.2016.

Шемом број 1 приказана је организациона структура.

Шема број 1: Организациона структура у 2017. години

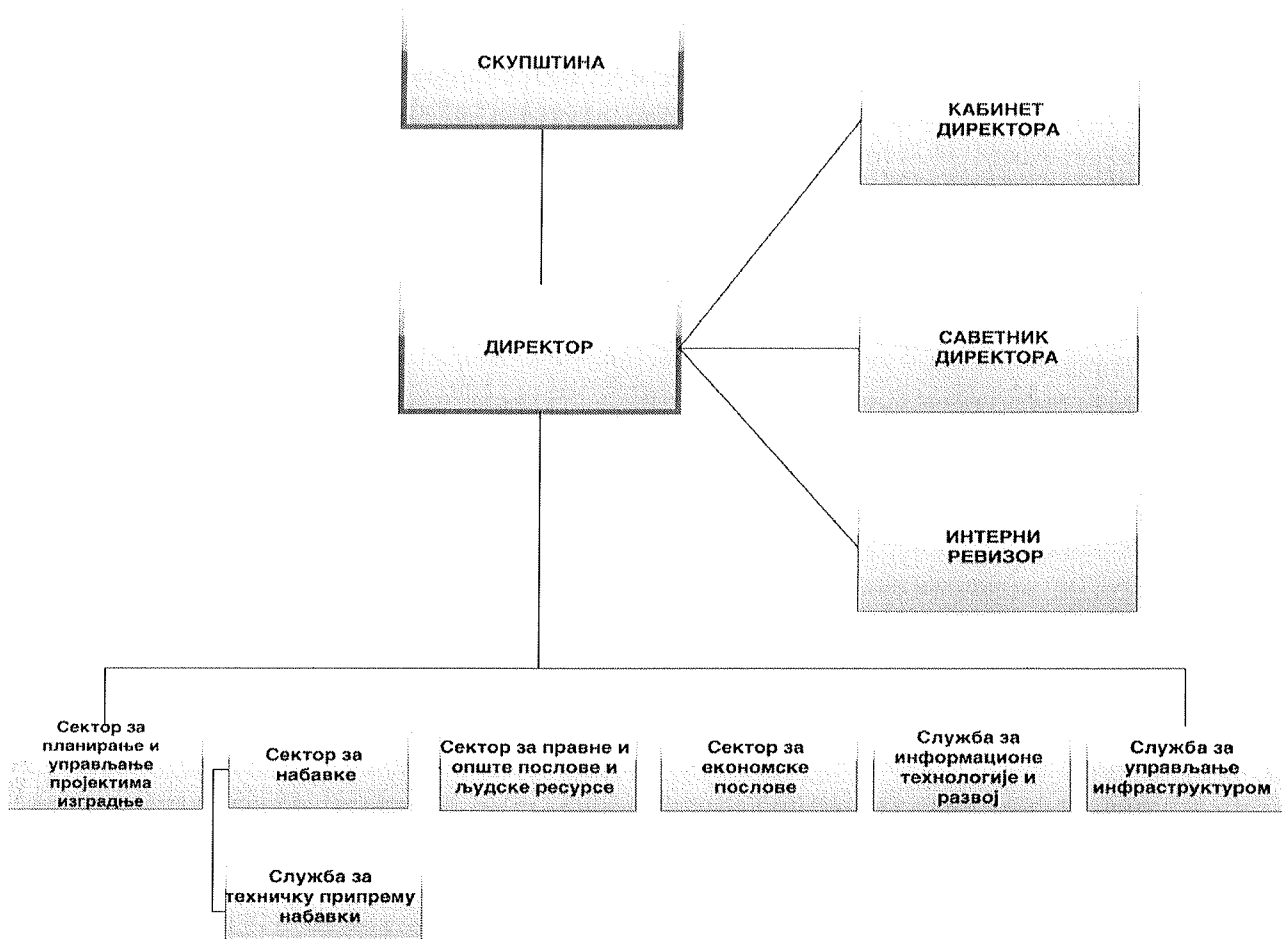

Поред презентоване вертикалне организационе структуре за реализацију поверних пројеката формира се и хоризонтална организациона структура – пројектни тимови за сваки пројекат понаособ.

С обзиром да је ЈУП динамично привредно друштво које се константно развија и чији се обим посла мења, у 2018. години ће се организација Друштва прилагођавати новонасталим потребама реализације поверених пројеката

2. РЕЗИМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2010-2017. ГОДИНЕ И ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Узимајући у обзир основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета РС за 2018. годину као и упутстава за припрему програмских буџета за период 2017-2020. године уважавајући остварену реализацију пројеката за период 2010 - 2017. године, као и поверене задатке од стране Владе Републике Србије можемо истаћи следеће:

1. Предлог Финансијског плана за 2018. годину је сачињен у складу са Одлукама о оснивању Друштва („Службени гласник РС“ број 51/10, 72/2013, 24/14 и 65/14, 110/2016 и 26/2017), и Закључком Владе 05 Број: 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године.
2. Програм Истраживање и развој у јавном сектору финансиран је кредитним линијама Европске инвестиционе банке на износ од ЕУР 200 милиона и из две линије Европске банке за развој Савета Европе на ЕУР 35 (уговор 1711) и ЕУР 70 милиона (уговор 1739), средствима ИПА фондова, средствима из Буџета као и другим средствима које обезбеди Република Србија. Рок расположивости кредитне линије Европске инвестиционе банке који је по основном уговору истекао у децембру 2015. године продужен је Анксом уговора до 31. 12. 2020. године. С обзиром на Закључак Владе бр. 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године даља реализација Пројекта поверна је Канцеларији за јавна улагања, а ЈУП је сходно поменути Закључку остао у обавези да реализује потписане уговоре са трећим лицима за потпројекте у току што обухвата коначни завршетак потпројеката Набавка капиталне опреме за истраживања, Централизован систем набавке потрошног материјала и Изградња станова за младе истраживаче у Крагујевцу, затим окончање свих потписаних уговора на потпројектима у току чија је даља реализација супендована (Центар за промоцију науке и Нано центар) као и наставак реализације два инфраструктурна пројекта Центри изврности у Крагујевцу и Технолошки парк у Новом Саду из средстава кредита ЕИБ-а.
3. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва 05 Број: 02-6948/2013 од 09. августа 2013. године („Службени гласник РС“ бр. 72/13) предвиђено је да Друштво обавља и послове пружања услуга консалтинга и менаџмента у вези са спровођењем националног дела Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице (РХП), који се односе на припрему техничке и тендерске документације, спровођење поступака јавних набавки, уговарање, интерну контролу, финансијско-рачуноводствене услуге, мониторинг и извештавање и пружање других специјализованих услуга неопходних за реализацију националног дела регионалног Програма. Реализација овог Програма започела је у четвртм кварталу 2013. године, и првобитно је било предвиђено је да буде завршена до краја 2017. године односно најкасније у првој половини 2018. године, међутим извесно је, након последњих разговора са Банком за развој Савета Европе, да ће се спроводити и друга фаза пројекта чији је завршетак предвиђен до краја јуна 2021. године. До сада је потписано укупно 7 уговора и Анекса о донацијама са Банком за развој Савета Европе (ЦЕБ), од чега је први уговор о донацију (СРБ 1) фактички завршен, реализација осталих уговора је у току, а у припреми су још два нова уговора.
4. Национални део Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице финансира се делом средствима донација преко Европске банке за

развој Савета Европе, на основу Оквирног споразума о Регионалном програму стамбеног збрињавања избеглих лица, а делом из средстава Републике Србије. Финансирање дела оперативних расхода који настају у процесу реализације овог Програма обезбеђују се из средстава Европске уније преко Европске комисије кроз тзв. „оперативни грант“, а преко Европске банке за развој Савета Европе. Први уговор о донацију потписан је у јулу 2015. године и обухватао је период финансирања за 2015. и 2016. годину. Уговором је било предвиђено да се 47,5% укупно планираних оперативних трошкова ЈУП-а покрива контрибуцијом Републике Србије, међутим, средства контрибуције за ове намене нису била обезбеђена Буџетом РС за 2016. годину, те је током 2016. године покренута иницијатива у циљу потписивања Анекса уговора којим би се обезбедио финансирање имплементарне јединице- ЈУП-а за 2017. и 2018. годину, ЈУП ослободио обавезе приказивања контрибуције док би контрибуцију чинили трошкови имплементације пројекта КИРС-а и локалних самоуправа. Европска банка за развој Савета Европе је током месеца новембра завршила преговоре са Европском комисијом око донације за финансирање оперативних трошкова ЈУП-а и обавестила Министарство за европске интеграције да је Европска комисија донела одлуку о продужењу периода суфинансирања имплементације РХП пројекта до децембра 2018. године. Припремљен је Анекс Уговора о донацији којим је предвиђено да контрибуцију Републике Србије за период од 2016. до краја пројекта представља финансирање општина и Комесаријата за избеглице преко буџета док ће се ЈУП искључиво финансирати средствима донације. Предложени буџет од стране ЦЕБ-а за ЈУП у овом моменту износи ЕУР 820.000 за 2017. и исто толико за 2018. годину.

5. Како је промотер пројекта Министарство, просвете, науке и технолошког развоја уговором број 401-00-115/2014-01 од 03.02.2014. године, Друштву поверило на управљање оперативну реализацију пројекта „Програм модернизације школа“, који се финансира из средстава зајма Европске инвестиционе банке (ЕИБ) те ће се и током 2018. године одвијати значајне активности на овом Програму. Очекује се да се заврше сви постојећи уговори и да се покрене јавна набавка за адаптацију/изградњу/доградњу још 40 школа и опремање завршених објеката. Предвиђа се да ће уговор са ЕИБ-ом бити продужен до краја 2019. године. Иако се реализација самог програма води у књиговодству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Друштво ће на основу послова које обавља за Министарство, остваривати приходе од пружања услуга управљања и надзора.
6. Друштво ће као и у претходном периоду, а с обзиром на стратешко опредељење, и у у 2018. години вршити услуге послова управљања, надзора и пројектовања на реализацији изградње одобрених инфраструктурних пројеката и сличне услуге, те на тај начин остваривати сопствене приходе.

Резиме плана реализације поверених пројеката у 2018. години као и резиме резултата рада ЈУП-а на горе поменути пројектима за период 2010.-2017. године дати су у табели 1. Напомињемо да смо код плана прихода и расхода за 2018. годину приликом конверзије РСД/ЕУР користили курс 120 РСД/ЕУР .

Табела 1

РЕЗИМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2010- 2017. И ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	У МИЛ							
	Реализација 2010-2016. и процена реализације за 2017.				План за 2018.			
	РСД		€		РСД		€	
	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА
ПРОГРАМИ	26.389,84	19.727,62	225,18	171,59	7.482,60	10.632,12	62,36	88,60
Инвестиције у Програм Истраживање и развој	16.204,60	13.733,02	140,30	121,64	558,00	2.815,68	4,65	23,464
Модернизација школа	4.123,68	3.154,80	34,36	26,29	1.904,64	1.970,40	15,87	16,42
Инвестиције у "Национални део заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице" (РХП)	6.061,56	2.839,80	50,51	23,67	5.019,96	5.846,04	41,83	48,717
ЈУП								
ПРИХОДИ ЈУП	1.565,00	1.565,00	13,41	13,41	271,30	271,30	2,26	2,26
Будет (за Програ Истраживање и развој)	751,00	751,00	6,45	6,45	60,00	60,00	0,50	0,50
Модернизација школа	70,95	70,95	0,58	0,58	50,00	50,00	0,42	0,42
Техничка помоћ за РХП	257,22	257,22	2,12	2,12	98,40	98,40	0,82	0,82
Сопствени приходи	485,83	485,83	4,26	4,26	62,90	62,90	0,52	0,52
РАСХОДИ ЈУП	1.565,00	1.565,00	13,41	13,41	271,30	271,30	2,26	2,26
Оперативни расходи	1.532,25	1.532,25	12,67	12,67	269,10	269,10	2,24	2,24
Набавка опреме и софтвера ЈУП-а	32,75	32,75	0,74	0,74	2,20	2,20	0,02	0,02

3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТПРОЈЕКТА ОКВИРНОГ ПРОЈЕКТА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ЗА 2018. ГОДИНУ И ОКВИРНИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период 2010. - 2015. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 13/2010 Влада РС је дефинисала националне и научне приоритете и партнерства са и између институција и предузећа како би се омогућило да се на домаћем и светском тржишту валоризују идеје, услуге и производи засновани на знању. Реализација Стратегије и њених циљева започета је кроз одређивање листе националних научних приоритета, и развијање Програма „Ревитализација истраживања и развоја у јавном сектору у Србији“ (у даљем тексту: оквирни Пројекат) чија оквирна вредност износи ЕУР 420,8 милиона што укључује и ЕУР 25,6 милиона из средстава ИПА фондова.

С обзиром да је период за који је Стратегија донета истекао и да се ушло у нови петогодишњи пројектни циклус, Министарство просвете, науке и технолошког развоја приступило је изради нове Стратегије за период 2016-2020. године којом су преиспитана планирана а незавршена улагања у научну инфраструктуру у претходном периоду и измењени или одређени нови приоритети у научном и технолошком развоју.

Финансијским уговором (Истраживање и развој у јавном сектору) вредним ЕУР 200 милиона између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (ЕИБ), закљученим у марту 2010. године, предвиђено је финансирање оквирног Пројекта. Овај уговор је потврђен од стране Народне скупштине кроз доношење Закона о потврђивању („Службени гласник РС“, број 5/10). Наведеним Финансијским уговором, Министарство просвете, науке и технолошког развоја одређено је за промотера оквирног Пројекта одговорног за његову реализацију, а Република Србија се обавезала да образује јединицу за управљање оквирним Пројектом и да обезбеди средства за њено квалитетно функционисање за време трајања Програма. Рок расположивости неповучених средстава предвиђених овим уговором истекао је 31.12.2015. године а продужн је Анкесом на период до краја 2020. године.

Влада Републике Србије такође је обезбедила у сарадњи са Европском банком за развој Савета Европе додатне две кредитне линије за финансирање овог оквирног Пројекта и то на ЕУР 35 милиона Уговор број 1711 (2010) (где су средства повучена и кредит ће у целости бити реализован до краја 2017. године), и на ЕУР 70 милиона Уговор број 1739 (2011) код кога је рок расположивости истекао 30. јуна 2015. године и који је сагласношћу ЦЕБ-а продужен до септембра 2018. године. Реализацију потпројеката предвиђених овим кредитом изузев потпројекта Станови за младе научне раднике у Крагујевцу даље ће реализовати Кнцеларија за јавна улагања.

У оквиру програма „Истраживање и развој у јавном сектору“ квалификовано је Стратегијом научног и технолошког развоја 29 потпројеката за финансирање из средстава Европске инвестиционе банке, Банке за развој Савета Европе и других средстава које обезбеди Република Србија. За 20 предвиђених потпројеката закључени су Уговори о реализацији са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Од тог броја, 7 потпројеката односно Уговора је реализовано, и то: Централна зграда Универзитета у Новом Саду, НТП Нови Сад 1. фаза, НТП Звездара Београд, Санација темеља Хемијски факултет у Београду, Природњачки центар Свилајнац, Истраживачка станица Петница и Станови за младе истраживаче у Блоку 32 (Фаза 1.).

У 2017. години у току је била реализација следећих 7 потпројеката, и то: наставак реализације пројеката Капитална опрема, Потрошни материјал, Нано-центар Београд, Центар за промоцију науке Београд, Станови за младе истраживаче Крагујевац, Центар изврсности Крагујевац, и потпројекат Научно-технолошки парк Нови Сад (Фаза 2.). Потпројекти Капитална опрема, Потрошни материјал и Станови за младе истраживаче Крагујевац фактички су већ реализоване и остало је само да се потпишу коначни обрачуни и записници и изврши коначна исплата појединим добављачима.

За 2018. и 2019. годину предвиђено је да Друштво реализује следеће потпројекте: Центар изврсности Крагујевац, Научно-технолошки парк Нови Сад 2. Фаза. Друштво је планом предвидело и набавку капиталне опреме у вредности од ЕУР 4 милиона за потпројекат Центри изврсности у Крагујевцу с обзиром да има потписан Уговор о реализацији овог потпројекта са Министарством и да исти није још увек ревидиран те та обавеза ЈУП-а остаје актуелна.

Статус потпројеката Нано-центар Београд и Центар за промоцију науке Београд, и даље није јасно дефинисан од стране Промотера, док ЈУП у 2018. години није предвидео активности на овим потпројектима, изузев у делу реализације где постоје активни, а незавршени уговори са трећим лицима. Очекује се да ће уговори са Министарством просвете, науке и технолошког развоја о даљој реализацији ова два потпројекта бити раскинути, као што је то био случај са свим осталим уговорима за потпројекте где до 13. јуна 2016. године нису биле отпочете активности.

У процесу припреме плана за 2018. годину везано за оквирни Пројекат Истраживање и развој Друштво је Министарству просвете, науке и технолошког развоја као и Министарству финансија кроз Извештаје о реализацији пројектних зајмова проследило информације о планираним потребним средствима за успешну реализацију Пројекта у 2018. години што имплицира потребна средства у износу од 23,4 милиона из кредита ЕИБ-а и других средстава РС (Технички факултет у НС, Универзитет и град Крагујевац) за 2018. годину и 3,2 милиона за 2019. годину за потпројекте које је Друштво на основу Закључка Владе од 13. јуна 2016. у обавези да заврши.

За зајам ЦЕБ-а 1739 Друштво није давало предлоге за повлачење средстава пошто нема потписаних нових уговора са трећим лицима које би требало реализовати у 2018. години, изузев за потпројекат Изградња станова за младе истраживаче у Крагујевцу за који су средства већ повучена и алоцирана.

Међутим, Влада Републике Србије је предложила, а Скупштина Републике Србије усвојила буџет за 2018. годину којим је предвиђено да се за оквирни Пројекат Истраживање и развој, на разделу Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру извора 11 – Примања, од иностраних задуживања издвоји свега РСД 500.000.000 (противвредност од око ЕУР-а 4,16 милиона) .

Приликом израде овог плана Друштво није имало прецизна сазнања о тренутним активностима министарстава, Владе и Канцеларије за јавна улагања везано за преговоре са банкама – финансијерима као ни прецизне информације о инфраструктурним потпројектима који ће се из ових средстава финансирати у наредном периоду, те је стога план за 2018. годину базиран на потписаним уговорима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја о реализацији горе поменутих потпројеката у току, потписаним уговорима које Друштво има са трећим лицима и уговорима које Друштво планира да закључи ради завршетка започетих потпројеката. План такође садржи и информације о реализованим потпројектима и статусу уговора које ЈУП има са Министарством као промотером Пројекта.

У табели 2. дата је планирана реализација за оквирни Пројекат Истраживање и развој у јавном сектору по потпројектима:

Табела 2

ОКВИРНИ ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ															
Реализација понућених средстава за период 2010-2016. године, процене реализације за 2017. годину и план реализације за 2018. и 2019. годину															
Ред. бр.	Ниво	Пројекат	Одобрени буџет на средства издржава ВРБ/ДВБ према Уговору са Министарством	укупно утрошено 2010-2016	укупно утрошена средства 2010-2016.	2017 план уговори (процена)	2017 утрошена средства (процена)	укупно утрошено 2010-2017 процена	укупно утрошена средства 2010-2017. процена	2018 план уговори	2018 утрошена средства план	2019 план уговори	2019 утрошена средства план	Укупно понућени трошкови реализације	Напомене
1	ВРБ	Центар за промоцију науке - Блок 39, Београд	65.000.000,00	3.655.544	3.262.346	0	0	3.655.544	3.262.346		393.144			3.655.544	Промотер одлучије о наставку реализације, Пројекат на ревизија набављени део опреме користи ЦИИ
2	ВРБ	Природњачки центар Смедјан	6.275.689,00	6.262.237	6.262.237	0	0	6.262.237	6.262.237					6.262.237	завршено
3	ВРБ	Наноцентар, Блок 39, Београд	20.000.000,00	1.447.631	1.412.956			1.447.631	1.412.956		34.728			1.447.631	Промотер одлучије о наставку реализације, Пројекат на ревизија израђени припремни радови н. земљишту.
4	ВРБ	Опрема за Наноцентар, Блок 39, Београд	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0					0	Промотер одлучије о наставку реализације
5	50% ВРБ, 50% ЦФБ1	Набавка капиталне опреме за истраживање	50.000.000,00	34.933.156	31.592.329		3.211.494	34.933.156	34.803.823		129.333			34.933.156	опрема испоручена, остало је, измире обавезе према добављачима по потписаним коначним записницама о примопредаји
6	ВРБ	Систем за централизовану набавку потрошног материјала	40.000.000,00	29.404.278	28.793.415	33.806	616.151	29.438.084	29.409.566		28.518			29.438.084	Пројекат је реализован изузев уговора за испоруку гасова из због специфичности добара произведени
7	ВРБ и Фонд АП Војводине РСД 150 мил	Централна грађа Универзитета у Новом Саду	4.000.000,00	4.100.322	4.100.322	0	0	4.100.322	4.100.322					4.100.322	завршено
8	ВРБ	Научно технолошки парк Звездара, Београд	17.000.000,00	14.407.656	14.407.656	0	0	14.407.656	14.407.656					14.407.656	завршено
9	ВРБ	Научно технолошки парк, фаза 1, Нови Сад	1.398.130,00	1.393.725	1.393.725	0	0	1.393.725	1.393.725					1.393.725	завршено
10	ВРБ и ФПТ ПНС ЕУР 3,7 мил	Научно технолошки парк, фаза 2, Нови Сад	9.601.870,00	12.976.733	0		1.451.347	12.976.733	1.451.347		11.679.060		1.297.673	12.976.733	реализација у току
11	ВРБ	Истраживачка станица Пешина, Ваљеву	9.040.064,00	8.727.501	8.727.501	0	0	8.727.501	8.727.501					8.727.501	завршено
12	ЦФБ1	Станови за младе истраживаче - Блок 32, Београд	10.000.000,00	8.493.744	8.483.620		10.124	8.493.744	8.493.744					8.493.744	завршено
13	ВРБ	Администрација простора УИНСЈО истраживачког центра ИРПЦУД, Београд	350.000,00	3	3	0	0	3	3					3	Промотер одлучије о наставку реализације, постоји главни пројекат, Центар није обезбеди грађевинску дозволу
14	ВРБ	Санација земља - Хемијски факултет Универзитета у Београду	800.000,00	731.251	731.251	266	266	731.517	731.517					731.517	завршено
15	ЦФБ2	Станови за младе истраживаче - Блок 32, Београд Фаза 3	6.665.000,00	0	0	0	0	0	0					0	Уговор са Промотером раскину није решено питање накнаде за земљиште, пројекат документа код Фондације
16	ЦФБ 2	Станови за младе истраживаче - Блок 32, Београд Фаза 2	8.335.000,00	0	0	0	0	0	0					0	Уговор са Промотером раскину није решено питање накнаде за земљиште, пројекат документа код Фондације
17	ЦФБ2	Станови за младе истраживаче - Крагујевац	6.860.000,00	5.564.489	5.079.453	34.659	34.035	5.599.148	5.113.488	150.852	636.512			5.750.000	реализација у току
18	ЦФБ2	Научно технолошки парк Ниш	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0					0	Уговор са Промотером раскину проблеми са локацијским условима, постоји идејно решење
19	ЦФБ2	Финансијска и техничка подршка ЈУП	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0					0	Уговор са Промотером раскину
20	ВРБ/Град Ки и Универзитет у Ки ЕУР 576.000	Центар извршености у Крагујевцу	14.000.000,00	8.132.188	132.034	0	1.999.819	8.132.188	2.068.952	4.500.000	10.563.236	1.943.812	1.943.812	14.576.000	реализација у току
21	ЦФБ2	Станови за младе истраживаче - Ниш	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором, зграда је завршен свој фази
22	ЦФБ2	Центри извршености - Биомедицински истраживачки центар	нема	294	294	0	0	294	294					294	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
23	ЦФБ2	Центри извршености - Полуприредно биотехнолошки центар, Нови Сад	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
24	ЦФБ2	Центри извршености - Институт ветеринарских наука	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
25	ЦФБ2	Станови за младе истраживаче - Нови Сад	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
26	ЦФБ2	Зграда институту, Блок 39, Београд	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
27	ВРБ	Суперрачунарска иницијатива	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
28	ВРБ	Администрација и санација зграде у Светогара Марковића 21, Београд	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
29	ВРБ	Замјене материјалне имовине	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
		Укупно		140.230.752	114.379.142	68.731	7.323.236	140.299.483	121.639.477	4.650.852	23.464.531	1.943.812	3.241.485	146.894.147	

Напомена: Нацрт плана реализације за 2018. и 2019. годину урађен је на основу потписаних уговора између ЈУП-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја о реализацији подпројеката који су у току и које би ЈУП склонио закључу Владе РС од 13. Јуна 2016. године требао да заврши с обзиром на уговорне обавезе. Пројекцијом је обухваћена и набавка опреме за подпројекат Центра извршености у Крагујевцу с обзиром да је то предвиђено у уговору између ЈУП-а и Министарства.
